

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
1月
vol. 1

工事状況等

【進捗状況】


トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、往復100台/日にて三郷町及び山岡町にダンプ運搬しています。

【今月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も往復100台/日にて行う予定です。

冬休みも明け、小中学生の通学も再開されるため、ダンプトラックの運転手には運行ルールを再周知するとともに、引き続き路面凍結によるスリップ事故に細心の注意を払って運行を行います。また、切土工においても飛石対策を確実に行って作業していきますので引き続きよろしくお願いたします。

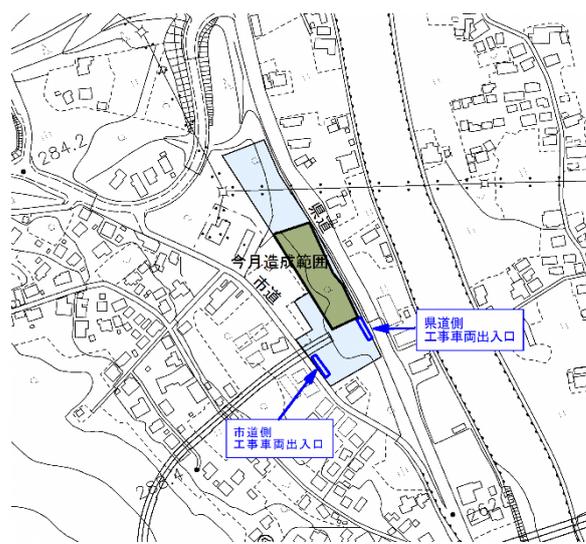

工事工程

工事内容	12月	1月	2月	備考
造成工	切土			
発生土運搬	100台(往復)	100台(往復)	100台(往復)	R5年度 1日最大100台(往復)

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

※年末年始閉所：12月29日～1月8日

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
2月
vol. 15

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、最大で往復 100 台/日にて三郷町にダンプ運搬しています。


【2月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復 100 台/日にて行う予定です。引き続き路面凍結によるスリップ事故に細心の注意を払い、交通安全に留意して運行を行います。

また、切土工においても低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等の使用により、周辺環境に配慮しながら作業を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。



大井非常口ヤード全景

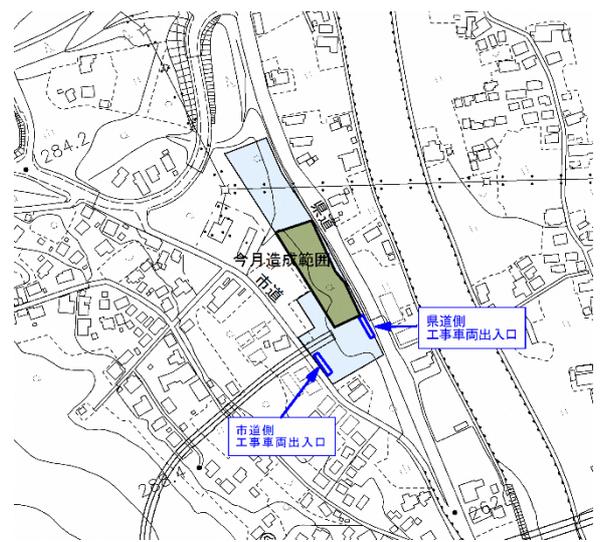

工事工程

工事内容	1月	2月	3月	備考
造成工	切土			
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
3月
vol. 16

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事とヤード北側にて水路の付け替え工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、最大で往復70台/日にて三郷町にダンプ運搬しています。

【3月の予定】


引き続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日にて行う予定です。

引き続き切土工事において低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等の使用により、周辺環境に配慮しながら作業を行ってまいります。また、発生土ダンプ運搬においても交通ルールを遵守して運行してまいります。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



大井非常口ヤード全景

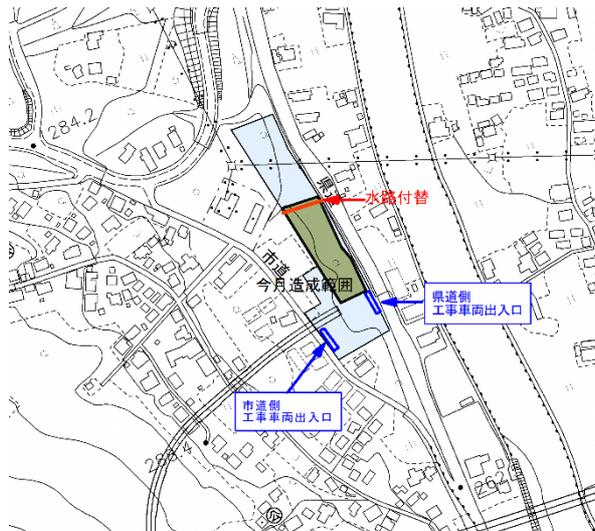

工事工程

工事内容	2月	3月	4月	備考
造成工	切土			
発生土運搬	70台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
4月
vol. 17

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事とヤード北側にて水路の付け替え工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、最大で往復100台/日にて三郷町にダンプ運搬しています。

【4月の予定】


引き続きヤード造成のための切土作業と水路の付け替え工事を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。場外では3月末から4月初めにかけて早層洞新田線の道路上に張り出した樹木の伐採作業を行います。

引き続き切土工において低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等の使用により、周辺環境に配慮しながら作業を行ってまいります。また、発生土のダンプ運搬においても交通ルールを遵守して運行してまいります。

春休みも始まり、お子様たちの外出も増えるため、安全運転をより一層心がけてまいります。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



大井非常口ヤード全景

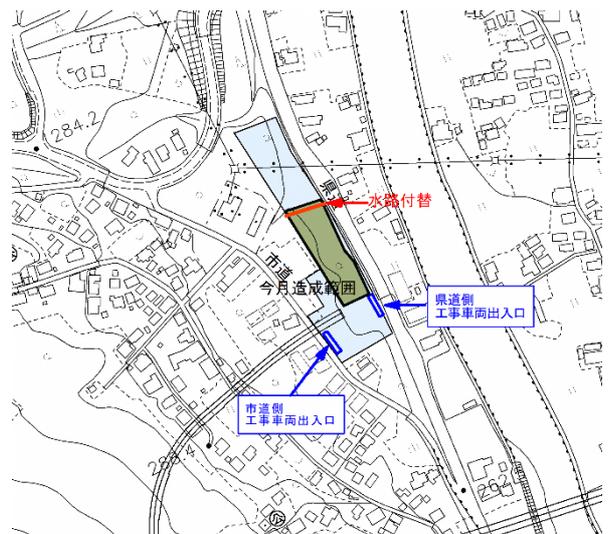

工事工程

工事内容	3月	4月	5月	備考
造成工	切土・水路付け替え		切土	
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R6年度 1日最大100台（往復）

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
5月
vol. 18

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事とヤード北側にて水路の付け替え工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、最大で往復100台/日にて三郷町にダンプ運搬しています。

また、場外では3月下旬から4月上旬にかけて早層洞新田線の道路上に張り出した樹木の伐採を行いました。



大井非常口ヤード全景


【5月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

引き続き切土工において低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等の使用により、周辺環境に配慮しながら作業を行ってまいります。

また、5/20より施工ヤード南側を横断している水路の付替え工事を行います。

ゴールデンウィークの現場閉所期間は4/27～5/6までを予定しております。発生土運搬における安全運転を心がけると同時に、切土作業における周辺環境への影響にも配慮して工事を進めてまいります。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

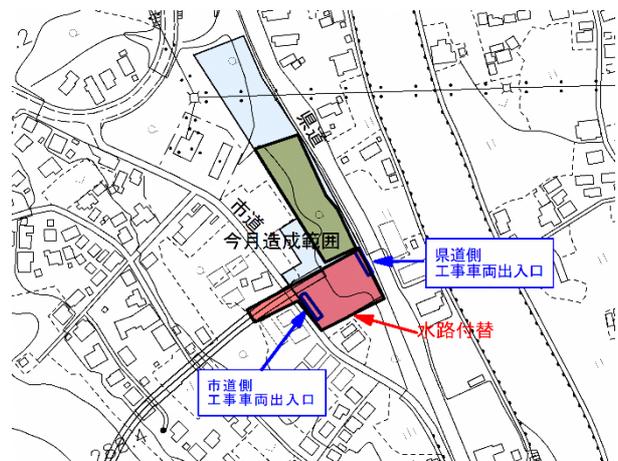

工事工程

工事内容	4月	5月	6月	備考
造成工	・切土 ・水路付替え (ヤード北側)	・切土 ・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	100台(往復)	100台(往復)	100台(往復)	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
6月
vol. 19

工事状況等

【進捗状況】（5.22 時点）

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を5/17まで行い、5/22より施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行いました。切土工事とともに発生する土は、最大で往復100台/日にて三郷町にダンプ運搬しました。

また、5/22に三郷町の発生土置き場にて破砕機を用いて切土工事で発生した岩の試験破砕を行い、周辺環境への影響に問題がなければ5/28から本格的に破砕作業を行います。




大井非常口ヤード全景

【6月の予定】

引き続き施工ヤード南側の水路付替え工事を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。（既設水路から新設水路への切替えは、新しい水路を設置した上で慎重に行っていきます。）

また、三郷町の発生土置き場にて岩の破砕作業を行う予定です。

水路付替え工事において、引き続き切土工事に伴う重機の稼働があるため、低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等の使用により、周辺環境への影響に配慮して工事を進めてまいります。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

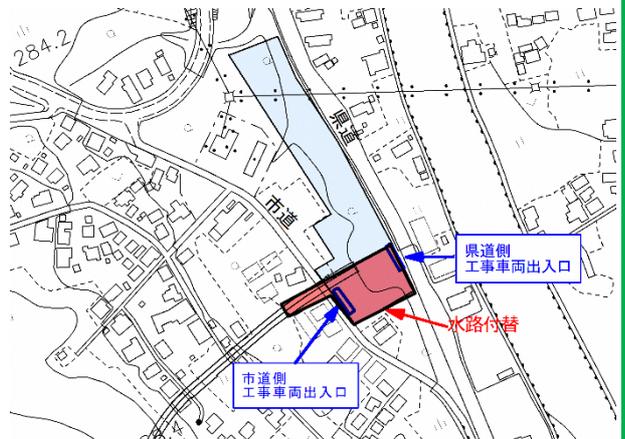

工事工程

工事内容	5月	6月	7月	備考
造成工	・切土 ・水路付替え (ヤード北側)	・水路付替え (ヤード南側) ・岩破砕(三郷)	・水路付替え (ヤード南側) ・岩破砕(三郷)	
発生土運搬	100台(往復)	100台(往復)	100台(往復)	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
7月
vol. 20

工事状況等

この度は、長島トンネル名古屋方の遮水型土砂ピット観測井における水質調査で、六価クロム基準値が超過したにもかかわらず、確認不足のため超過に気づくのが遅れ、岐阜県への報告が遅れたことにつきまして地域の皆様大変なご迷惑とご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。再発防止に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

【進捗状況】（6.15 時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。

水路の付替え工事ともなって発生する土は、施工ヤード内に仮置きしたため三郷町へダンプ運搬は行っておりません。

また、三郷町の発生土置き場にて造成工で発生した岩の破碎作業を行っております。



大井非常口ヤード南側


【7月の予定】

引き続き施工ヤード南側の水路付替え工事を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

また、三郷町の発生土置き場にて岩の破碎作業を行う予定です。

水路付替え工事において、引き続き切土作業に伴う重機の稼働があるため、低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等を使用し、周辺環境に配慮して工事を進めてまいります。また、7月下旬から8月上旬にかけて、大型土嚢等撤去作業のため県道の片側交互規制を行う可能性がございます。規制を行う際の規制時間は9:00～17:00とし、歩行者通路は規制中も確保いたします。

梅雨に伴いまとまった降雨が予想されるため、排水システムの整備も行っております。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

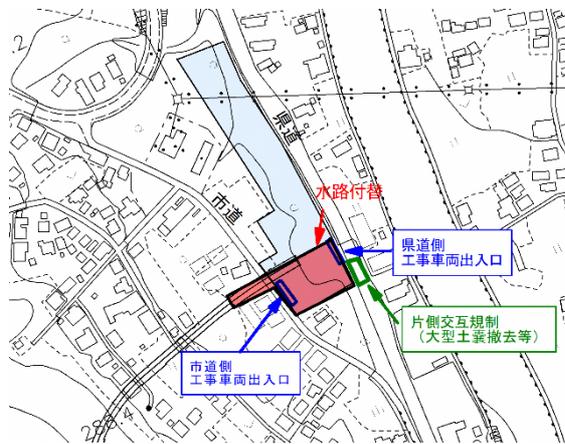

工事工程

工事内容	6月	7月	8月	備考
造成工	・水路付替え (ヤード南側) ・岩破碎 (三郷)	・水路付替え (ヤード南側) ・岩破碎 (三郷)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	運搬なし	100台 (往復)	100台 (往復)	
片側交互規制 (県道)		県道規制	県道沿い大型土嚢撤去等	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
8月
vol. 21

工事状況等

【進捗状況】（7.19時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。

水路の付替え工事にもなって発生する土は、施工ヤード内に仮置きしたため三郷町へダンプ運搬は行っておりません。

先月度の工事だよりにてお知らせいたしました県道の片側交互規制につきましては、工事の進捗により延期いたします。



大井非常口ヤード南側

【8月の予定】


引き続き施工ヤード南側の水路付替え工事を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

また、7月下旬から8月上旬にかけて行う計画であった県道の片側交互規制は、工事の進捗により9月中旬ごろを予定しております。規制の詳細につきましては、次号の工事だよりにてお知らせさせていただきます。

夏季休工につきましては、8/10～8/19を予定しております。

引き続き現場周辺への環境にも配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、時期は未定ですが、非常口トンネル（斜坑）掘削（発破にて掘削することを考えています）を行う際は、改めて事前にお知らせさせていただきます。近隣にお住いの方々に発破掘削についてのご理解を頂くため、別途ご説明をさせていただきたいと思っております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

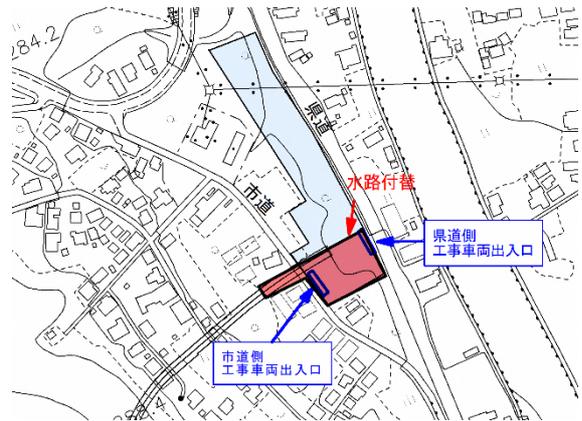

工事工程

工事内容	7月	8月	9月	備考
造成工	・水路付替え （ヤード南側）	・水路付替え （ヤード南側）	・水路付替え （ヤード南側）	
発生土運搬	運搬なし	100台（往復）	100台（往復）	
片側交互規制 （県道）			●●●● 県道規制	落石防護柵の撤去等

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026

担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
9月
vol. 22

工事状況等

【進捗状況】（8.20時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。付替え工事によって掘削した箇所は崩落等を防止するため、コンクリート吹付を実施しました。

水路の付替え工事にもなって発生する土は、施工ヤード内に仮置きしたため三郷町へダンプ運搬は行っておりません。

【9月の予定】


引き続き施工ヤード南側の水路付替え工事を行います。水路付け替え工事に伴い、9月中旬に県道72号にて飛石防護柵撤去のための片側交互通行規制を実施する予定です（規制の詳細につきましては別紙1を参照ください）。また、9月下旬から10月上旬に市道91013号にて水道管の切り回し及び側溝据付作業のための片側交互通行規制を1週間程度行う予定です（規制の詳細につきましては別紙2を参照ください）。

発生土ダンプ運搬は場外運搬が発生した場合、今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

工事に伴う道路規制により地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き現場周辺への環境にも配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



大井非常口ヤード全景

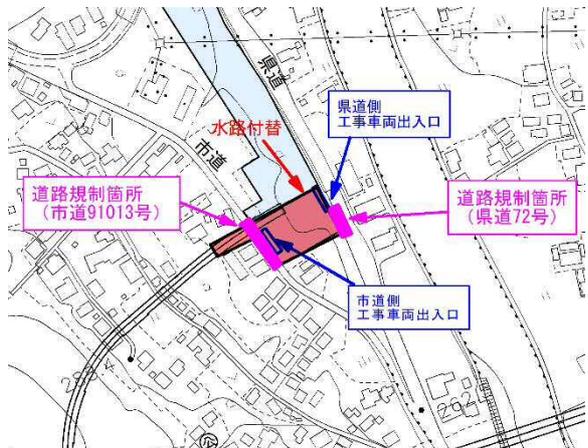

工事工程

工事内容	8月	9月	10月	備考
造成工	・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	運搬なし	100台(往復)	100台(往復)	
片側交互規制 (県道72号)		県道規制 ■■■■		飛石防護柵の撤去等
片側交互規制 (市道91013号)		市道規制 ■■■■		水道管切り回し 側溝据付

【工事に関するご意見・お問い合わせ】


中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

県道72号_片側交互通行規制 計画図

記号	①	②	③
名称	看板	看板	看板
イメージ図			
名称	看板	看板	カラーコーン
イメージ図			

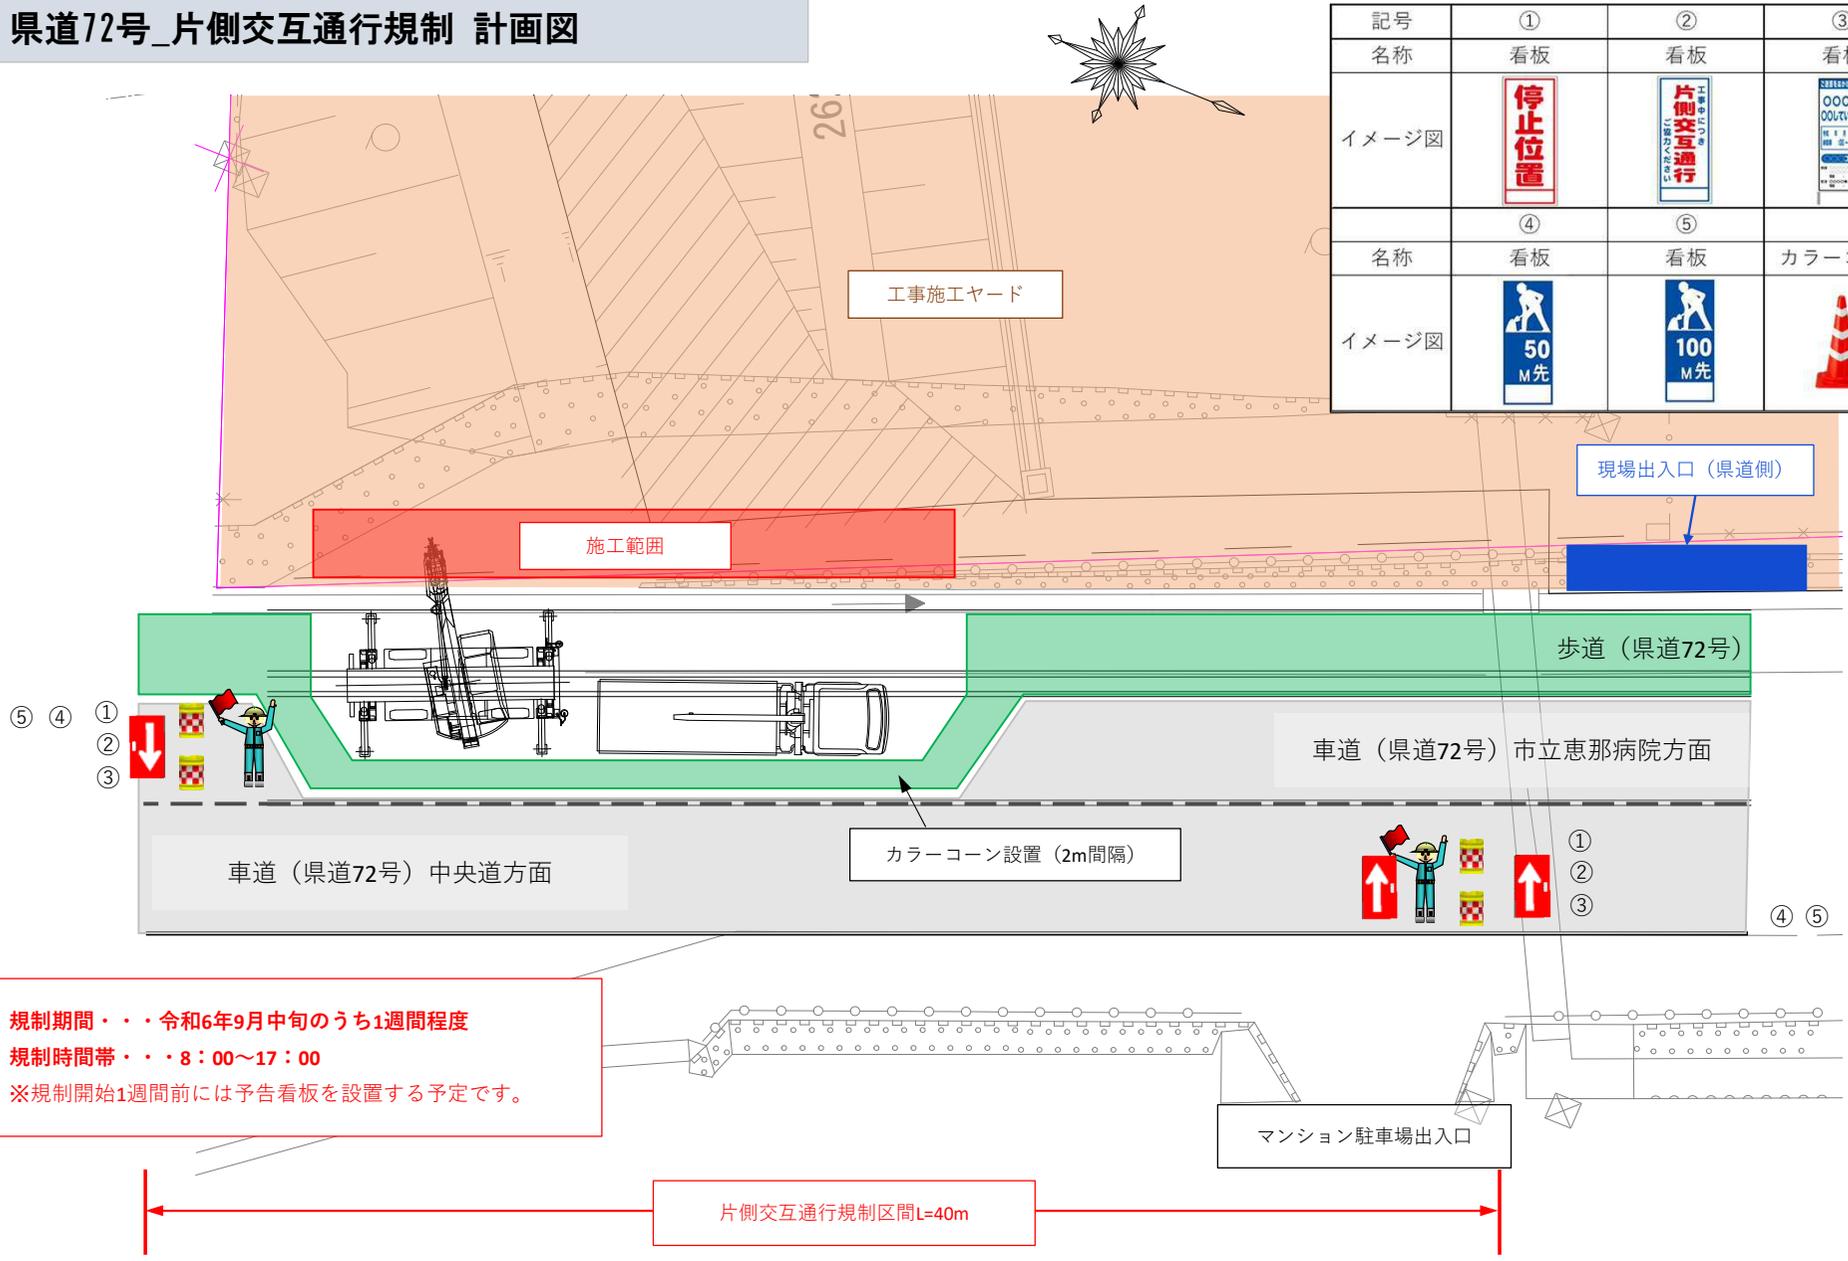

規制期間・・・令和6年9月中旬のうち1週間程度
 規制時間帯・・・8:00~17:00
 ※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

片側交互通行規制区間L=40m

マンション駐車場出入口

市道91013号_片側交互通行規制 計画図

作業により、反対車線においても片側交互通行規制を行います。

片側交互通行区間L=30m

現場出入口（市道側）

工事施工ヤード


規制期間・・・令和6年9月下旬～10月上旬のうち1週間程度

規制時間帯・・・8：00～17：00

※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。



記号	①	②	③
名称	カラーコーン	看板	看板
イメージ図			
記号	④	⑤	
名称	看板	看板	
イメージ図			

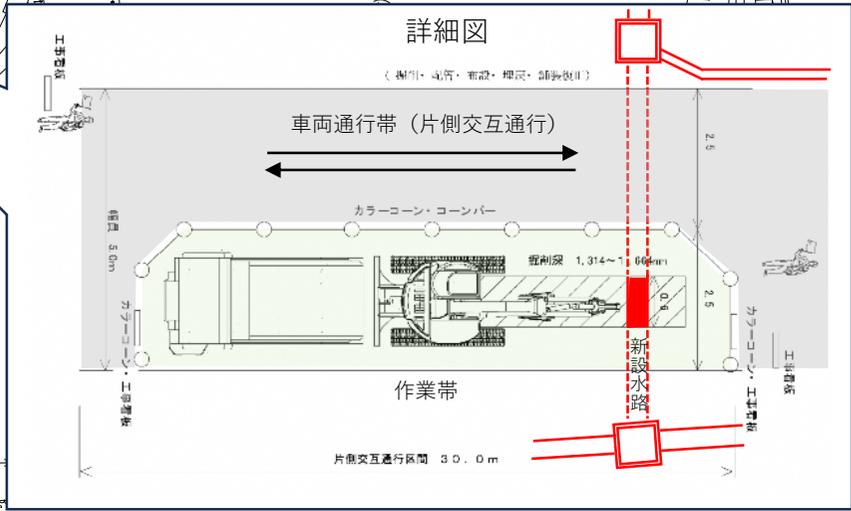

市立恵那病院方面

中央道方面

市道91013号

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
10月
vol. 23

工事状況等

【進捗状況】（9.15時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。

水路の付替え工事にもなつて発生する土は、施工ヤード内に仮置きしたため三郷町へダンプ運搬は行っておりません。

【10月の予定】

引き続き施工ヤード南側の水路付替え工事を行います。水路付替え工事に伴い、9月中旬に予定していた県道72号での飛石防護柵撤去のための片側交互通行規制は、10月中旬に実施する予定です（規制の詳細につきましては別紙1を参照ください）。また、9月下旬から10月上旬に計画していた市道91013号での水道管の切り回し作業のための片側交互通行規制についても、10月中旬から1週間程度行う予定です（規制の詳細につきましては別紙2を参照ください）。


発生土ダンプ運搬は場外運搬が発生した場合、今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

工事に伴う道路規制については工事の進捗により変更になる可能性があります、事前の周知看板を設置しお知らせいたします。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き現場周辺への環境にも配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



大井非常口ヤード全景

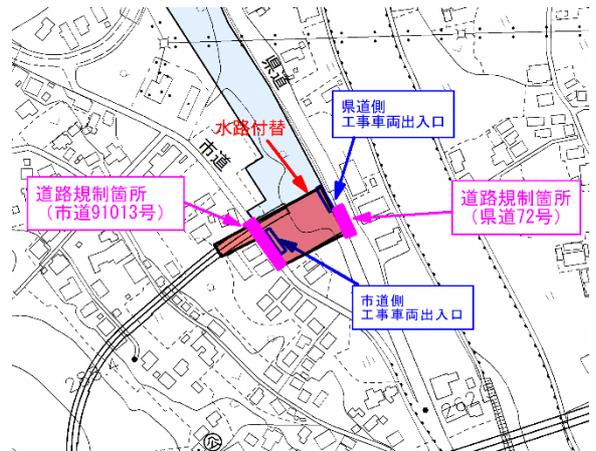

工事工程

工事内容	9月	10月	11月	備考
造成工	・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	運搬なし	100台(往復)	100台(往復)	
片側交互規制 (県道72号)		需給規制 ■■■		飛石防護柵の撤去等
片側交互規制 (市道91013号)		市道規制 ■■■		水道管切り回し


【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所


住 所 恵那市武並町藤208-1
電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

県道72号_片側交互通行規制 計画図




記号	①	②	③
名称	看板	看板	看板
イメージ図			
名称	看板	看板	カラーコーン
イメージ図			

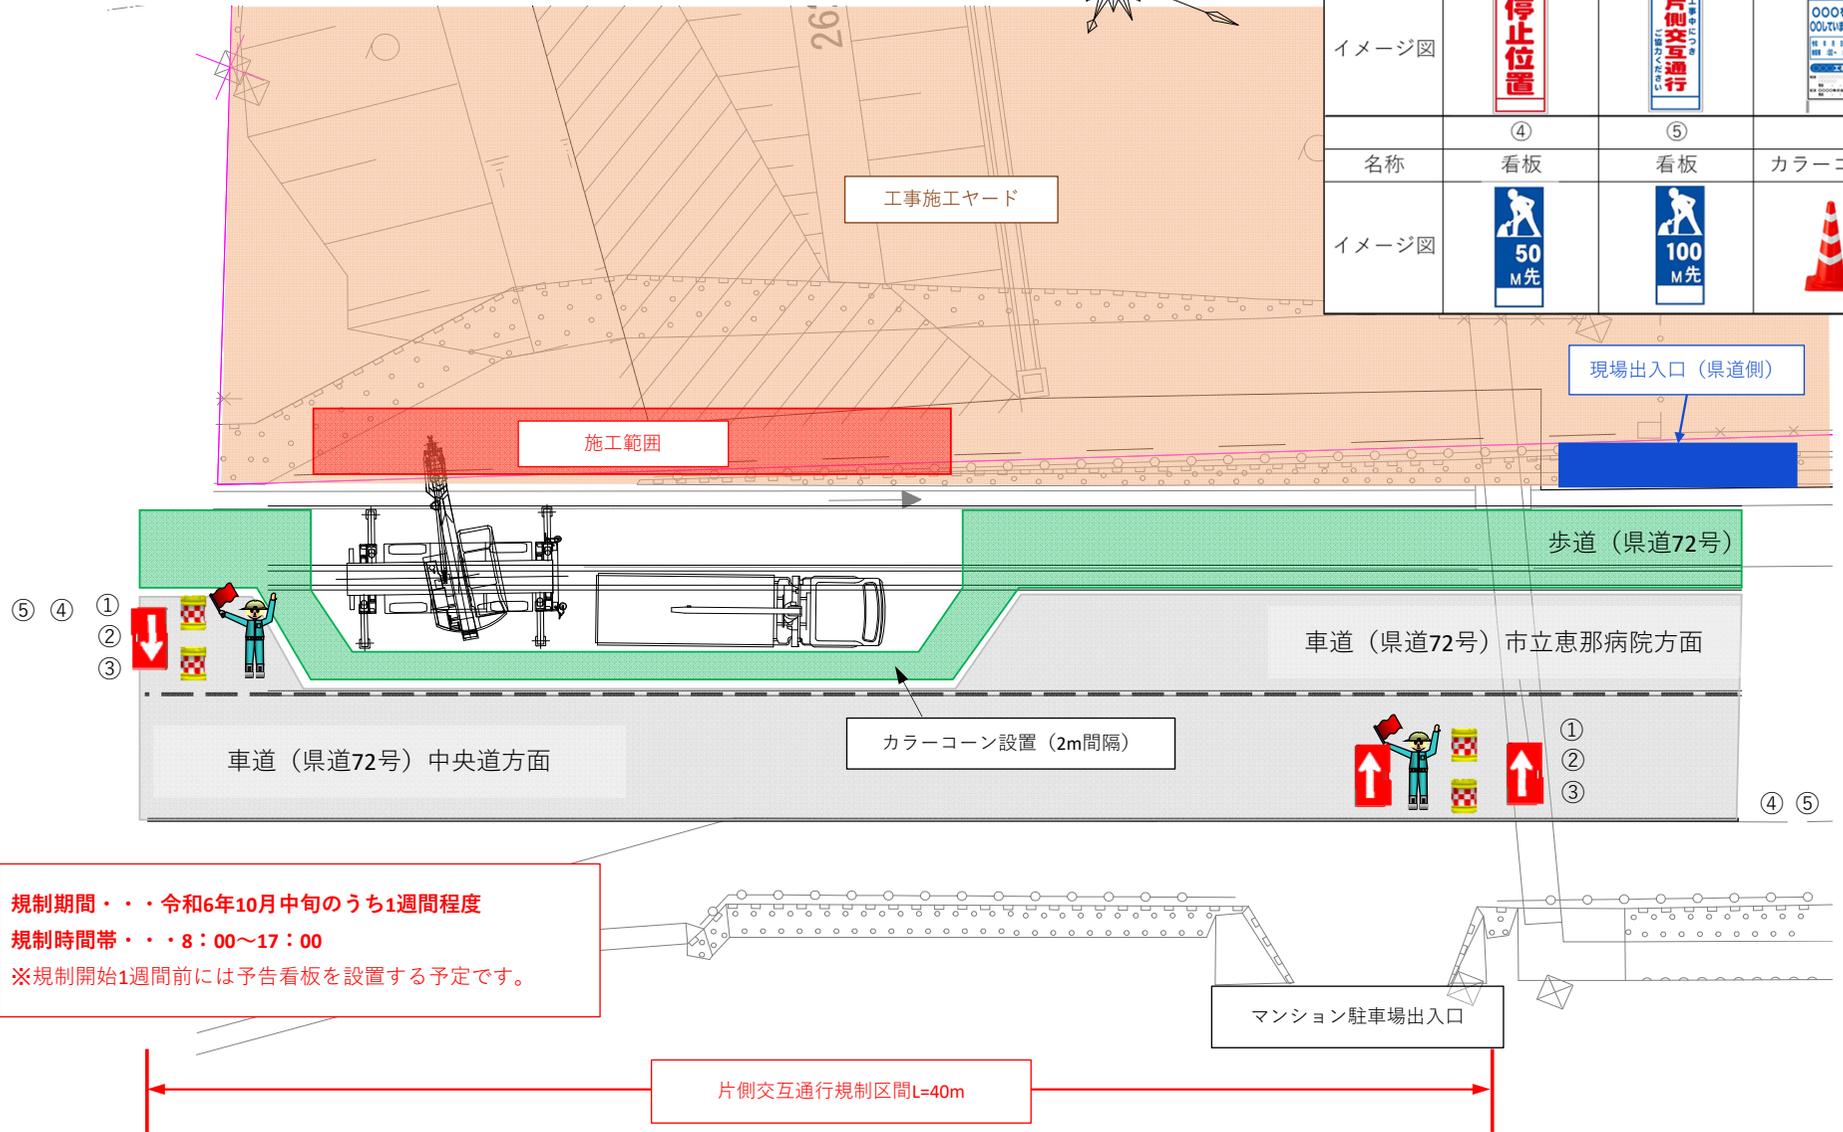


規制期間・・・令和6年10月中旬のうち1週間程度
規制時間帯・・・8:00~17:00
 ※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

片側交互通行規制区間L=40m

市道91013号_片側交互通行規制 計画図

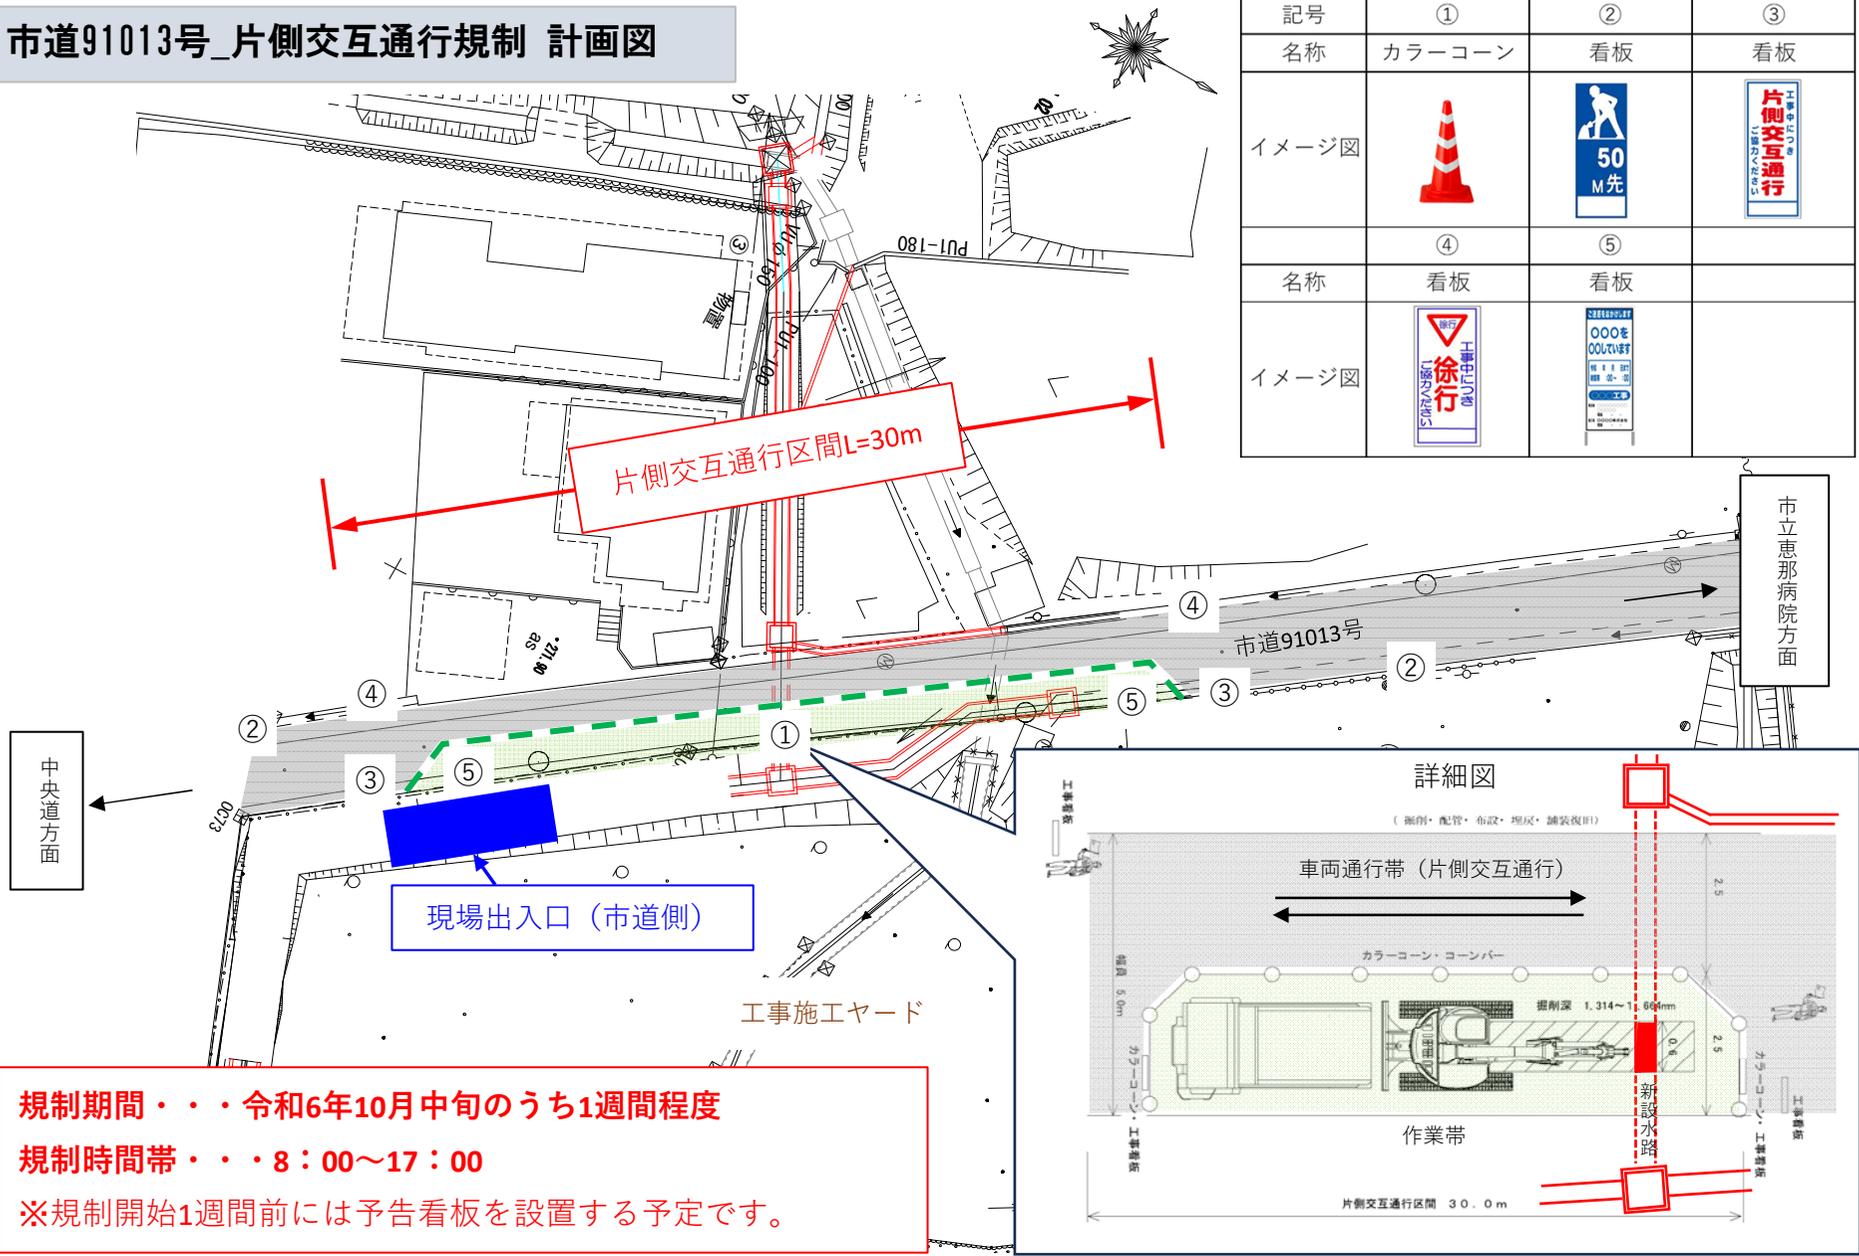

記号	①	②	③
名称	カラーコーン	看板	看板
イメージ図			
記号	④	⑤	
名称	看板	看板	
イメージ図			

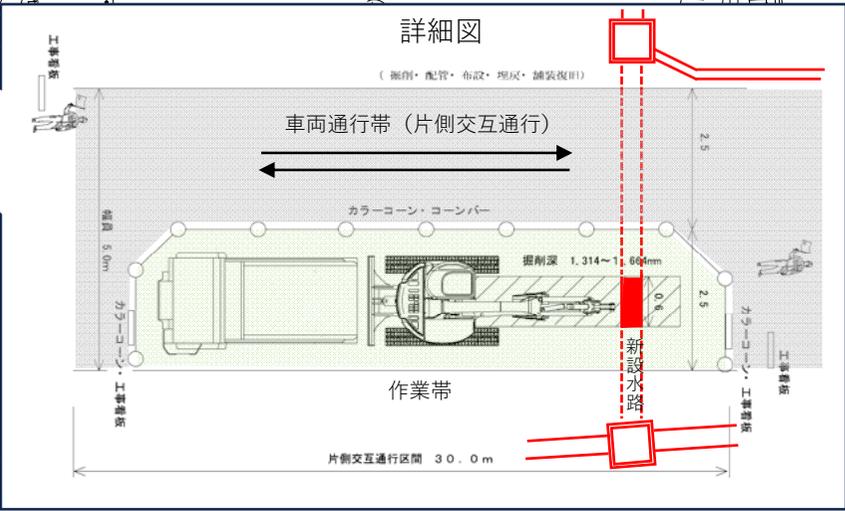

規制期間・・・令和6年10月中旬のうち1週間程度
 規制時間帯・・・8：00～17：00
 ※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
11月
vol. 24

工事状況等

【進捗状況】（10/15時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。

水路の付替え工事による掘削土は発生していないため、三郷町へダンプ運搬は行っておりません。

10/16～10/25で市道91013号にて水道管の切り回し工事を実施いたします。この工事に伴い市道の片側交互通行規制を実施いたします。また、10/21より県道72号にて飛石防護柵撤去を行います。撤去作業に伴い、県道の片側交互通行規制を1週間程度実施いたします。




大井非常口ヤード全景

【11月の予定】

11月の作業予定として、ヤード内の市道間際に仮囲いを撤去し、水路の据付作業を行います。作業時は、作業範囲を明示し、安全に留意して施工します。また、市道歩道側において、11月下旬から12月上旬にかけて片側交互通行規制を行い水路の据付作業を行います（別紙1参照）。

発生土ダンプ運搬は場外運搬が発生した場合、今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

片側交互通行規制等で地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き現場周辺への環境にも配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

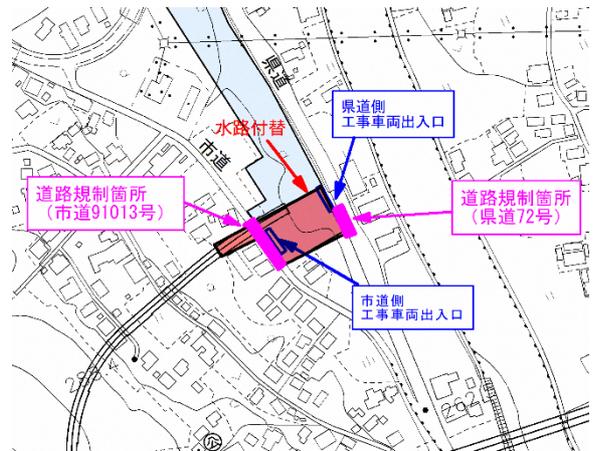

【工事工程】

工事内容	10月	11月	12月	備考
造成工	・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード西側)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	運搬なし	100台(往復)	100台(往復)	
片側交互規制 (県道72号)	県道規制			飛石防護柵の撤去等
片側交互規制 (市道91013号)	市道規制	市道規制		10月：水道管切り回し 11～12月：水路据付

【工事に関するご意見・お問い合わせ】


中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026 担当：小山


※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

市道91013号_片側交互通行規制 計画図

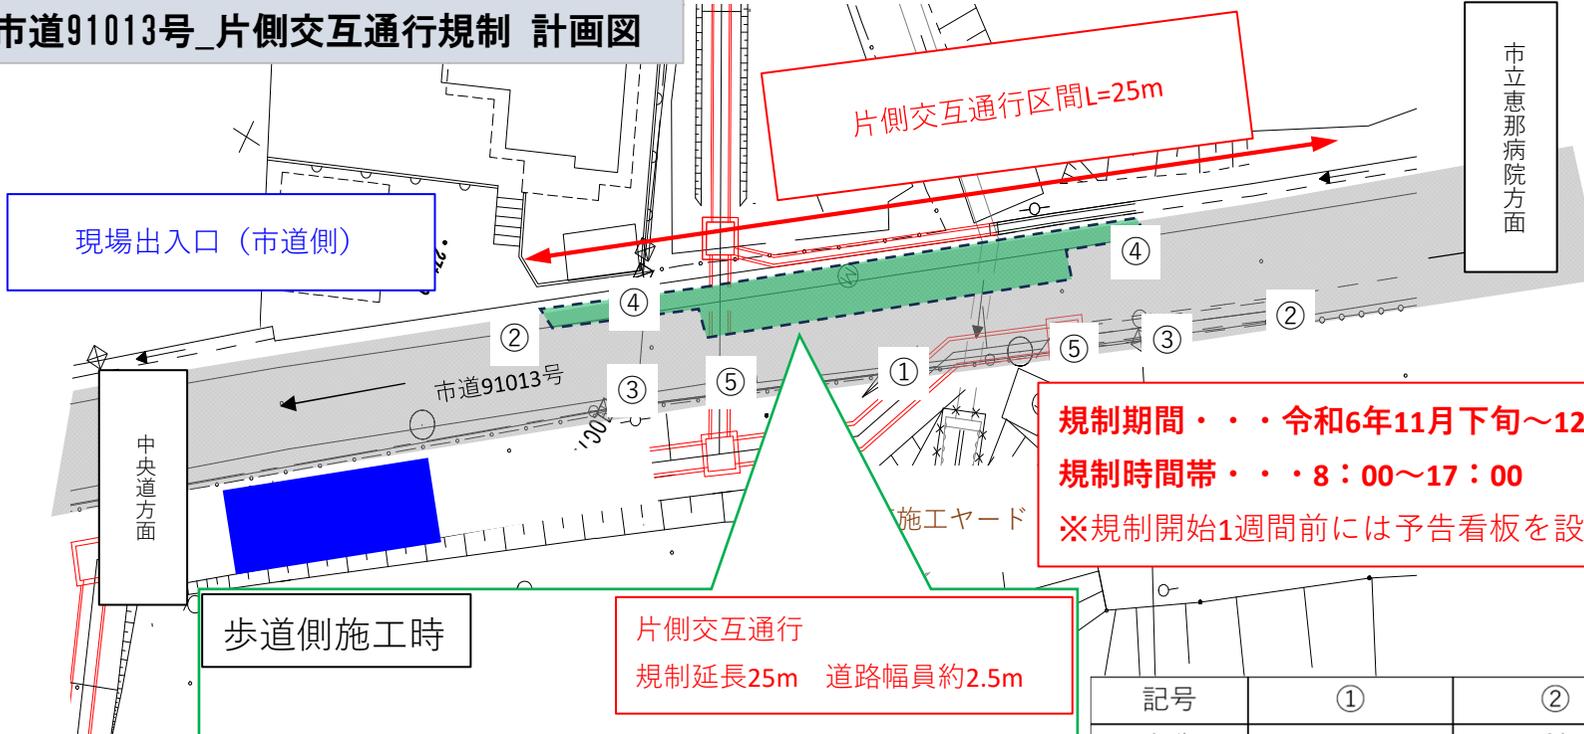

規制期間・・・令和6年11月下旬～12月上旬
 規制時間帯・・・8：00～17：00
 ※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

歩道側施工時
 片側交互通行
 規制延長25m 道路幅員約2.5m

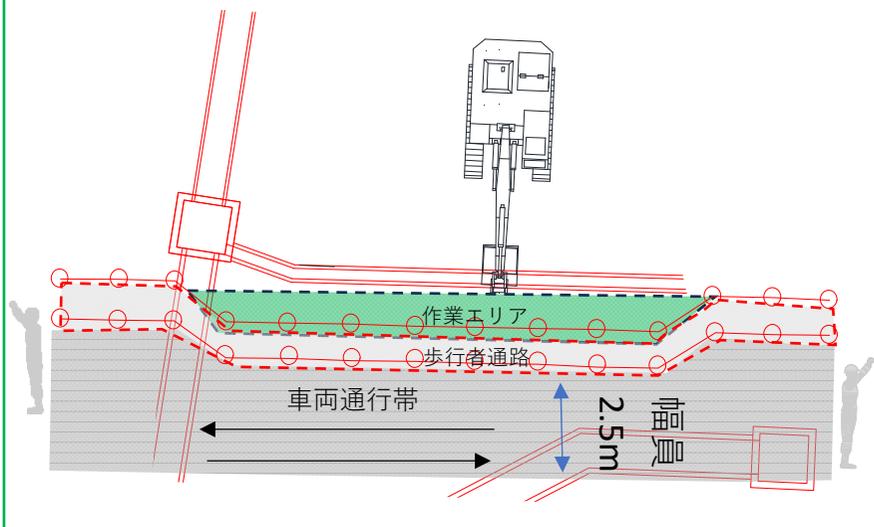

記号	①	②	③
名称	カラーコーン	看板	看板
イメージ図			
名称	看板	看板	
イメージ図			

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
12月
vol. 25

工事状況等

【進捗状況】（11/18時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。今回の期間における水路の付替え工事による掘削土は発生していないため、三郷町へダンプ運搬は行っておりません。

また、11/27～11/28に、県道側の工事用出入口の南側にて、飛石防護柵の組立作業を行います。この作業に伴い歩道を部分的に規制いたします。（終日通行可能です。）



大井非常口ヤード全景


【12月の予定】

12月の作業予定として、準備でき次第、ヤード内の市道間際に仮囲いを撤去し、水路の据付作業を行います。今回の作業に伴う市道の片側交互通行規制はありません。また、県道側においても水路据付のための掘削作業を行います。

発生土ダンプ運搬は場外運搬が発生した場合、今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

朝晩の冷え込みにより道路面の凍結が予想されるため、工事車両にスタッドレスタイヤを装着させ、スリップ事故の防止に努めます。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き現場周辺への環境にも配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

年末年始の休工は12/28（土）～1/6（月）を予定しております。

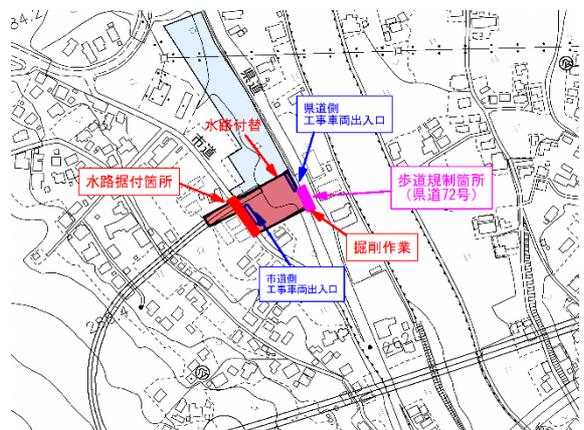

【工事工程】

工事内容	R6.11月	R6.12月	R7.1月	備考
造成工	・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード東側、西側)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	運搬なし	100台(往復)	100台(往復)	
歩道規制 (県道72号)	歩道規制			飛石防護柵の設置
片側交互規制 (市道91013号)			市道規制 R7.1月：水路据付(予定)	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026

担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
