

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2025年
4月
vol. 29

工事状況等

【進捗状況】（3/17時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。3月上旬より市道（工事ヤード①側）の片側交互通行規制を実施し水路の据付を行いました。3/17時点では工事ヤード①内にて、既設水路との接続作業を行っております。

今回の期間における水路の付替え工事による掘削土は発生していないため、三郷町へダンプ運搬は行っておりません。



大井非常口ヤード全景

【4月の予定】


4月上旬から中旬にかけて市道（工事ヤード②側）にて一部歩道際での規制を実施し、水路据付及び既設側溝との接続（一部撤去）作業を行います（別紙1参照）。

上記作業完了後、工事ヤード①、②内にて各所付替え水路箇所の埋戻し作業、整備を行います。

並行して工事ヤード①にてヤード造成のための切土工事を行います。

発生土ダンプ運搬は場外運搬が発生した場合、最大で往復100台/日で行う予定です。

4月度については、切土工事において低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等の使用により、周辺環境に配慮しながら作業を行ってまいります。また、発生土のダンプ運搬においても交通ルールを遵守し行ってまいります。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き安全と現場周辺への環境に配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

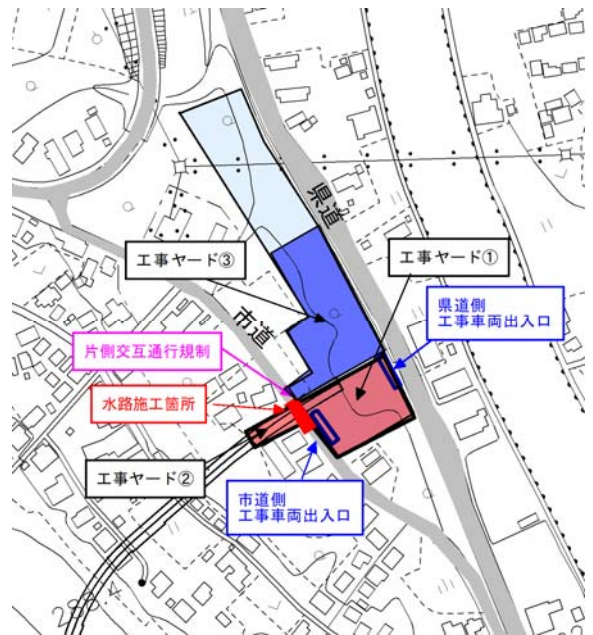

【工事工程】

工事内容	R7.3月	R7.4月	R7.5月	備考
造成工	・水路付替え（ヤード南側、西側）	・水路付替え、箇所埋戻し（ヤード西側）	・切土工	
発生土運搬	運搬なし	100台（往復）	100台（往復）	
交通規制（市道01317号）	工事ヤード①側規制			3月上旬～中旬：工事ヤード②側水路据付（片側交互通行規制） 3月下旬～4月中旬：工事ヤード③側水路据付、既設水路一部撤去（片側規制）
交通規制（県道72号）				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

市道01317号_片側交互通行規制 計画図

規制期間・・・令和7年3月31日～令和7年4月11日

(先の内、土日を除く1日程度)

規制時間帯・・・8：00～17：00

※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

※作業の進捗により前後する場合があります。

