

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
4月
vol. 5

工事状況等

【進捗状況】

ヤード内の伐採作業を行いました。県道側の伐採においては、道路の片側交互規制にご協力をいただき、ありがとうございました。

伐採に引き続き県道側の工事車両出入口の整備を行っています。




県道側伐採作業状況

【今月の予定】

4月中旬ごろまで県道側の工事車両出入口整備の作業を行います。この作業の関係で、4月10日から4月15日頃（※工事の進捗等により変更となる場合があります）まで再び県道の片側交互規制を実施させていただきます。規制時間は9:00～17:00までとなります。歩行者通路は確保します。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

県道側の工事車両出入口の整備が終わりましたら、準備が整いしだい発生土のダンプ運搬を開始いたします。ダンプ運搬は往復100台/日程度にて行う予定です。（状況により5月以降の運搬開始となる可能性があります）発生土運搬にあたっては、交通マナーをしっかりと守って運行いたしますのでよろしくお願いいたします。

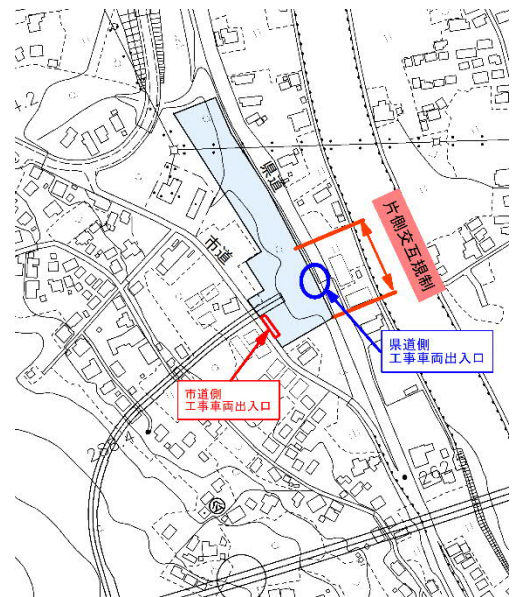

工事工程

工事内容	3月	4月	5月	備考
伐採工	伐採工			
ヤード造成	県道側出入口整備	切土		4/10～4/15 県道片側交互規制
発生土運搬		100台（往復）		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
