

中央新幹線日吉トンネル 武並工区工事だより

2023年
5月
vol.7

工事状況


【工事進捗】（4.24 現在） （長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 390 台/日）

藤川高架橋の橋脚（P2）の柱部の鉄筋型枠組立、橋脚（P3）は、基礎部の鉄筋型枠組立からコンクリート打設を行っています。


【5月の予定】 （長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 480 台/日）

藤川高架橋では、引続き橋脚（P2）の柱部の鉄筋型枠組立と、橋脚（P3）の基礎部の埋戻し、柱部の鉄筋型枠組立を行います。また、5月19日（金）に橋脚（P2）の柱部のコンクリート打設を予定しております。今回の打設は、生コン車が往復 50 台/日程度の搬入出で、8：30 より打設を開始致します。なお、先月同様にダンプの場外搬出はありません。どうぞ、宜しくお願い致します。

5月11日（木）に武並小学校にて、ダンプ安全教室を長島JVと共同開催する予定です。低学年の児童の皆さんに実際のダンプを見てもらい危険のポイントを知って頂きたいと思っております。引続き、地元に寄り添って工事を進めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。 ※コンクリート打設は天候等により日程が変更になる可能性があります。

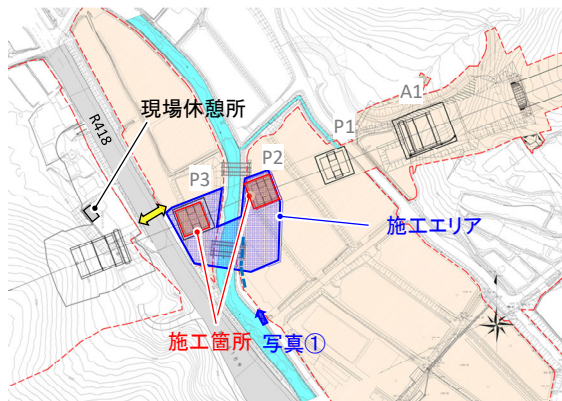

施工ヤード図

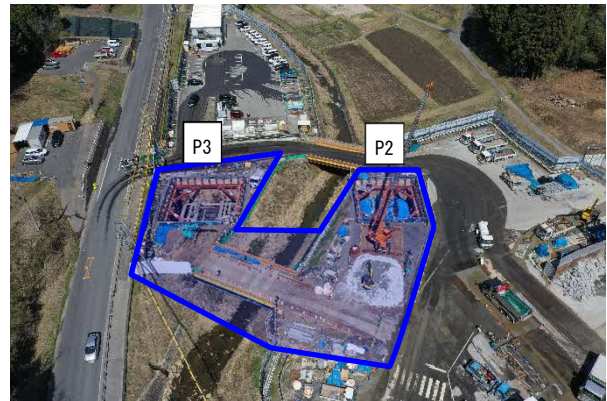

写真①

【工事工程】

施工内容		4月	5月	6月	記事
藤川高架橋 橋脚工	P2橋脚	埋戻し工	■		
		鉄筋工	■	■	■
		型枠工		■	■
		コンクリート工		■	
	P3橋脚	埋戻し工		■	■
		鉄筋工	■	■	■
		型枠工	■	■	■
		コンクリート工	■		■
藤川高架橋	発生土運搬				
長島トンネル	発生土運搬	390台(往復)	480台(往復)	480台(往復)	他工区

現場閉所予定：4月29日～5月7日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線日吉トンネル武並工区

清水建設株式会社



住 所：恵那市武並町藤 378-1
電 話：0573-28-3087

所長：藤野 副所長：白井
