

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
5月
vol. 6

工事状況等

【進捗状況】

県道側の工事車両出入口の整備工事を行いました。工事車両出入口の完成により、4月下旬からは造成工事で発生する残土のダンプ運搬も開始しています。発生土運搬のダンプ台数は往復100台/日程度で行っています。

【今月の予定】

今月も引き続きヤード内の造成工事を行います。発生土運搬も往復100台/日程度で行っていきます。発生土運搬のダンプは全て県道側から出入りします。ダンプの出入口には交通誘導員を配置し、歩行者及び一般車両との接触事故がないよう安全確認をしっかりと行って出入りします。


また、ヤード外周の仮囲いの設置作業を行います。この作業の関係で5月中旬に市道の片側交互規制を1日程度予定しています。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

その他作業として、県道沿いの既設ブロック積擁壁の取り壊し作業も行います。県道に対する飛散防止等の安全対策をしっかりと行って作業します。

ゴールデンウィークの休工は4/29～5/7となります。



県道側工事車両出入口

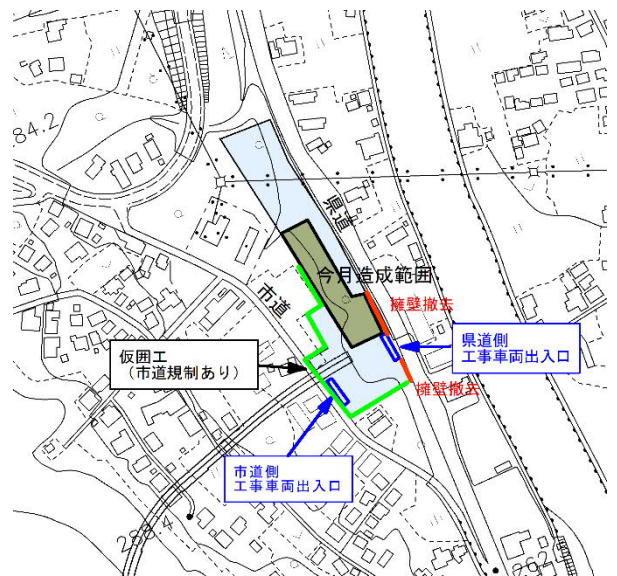

工事工程

工事内容	4月	5月	6月	備考
ヤード造成	県道側出入口整備 切土 県道規制			
発生土運搬	100台 (往復)			R5年度 1日最大100台 (往復)
仮囲工		仮囲い設置 市道規制		市道片側交互規制1日程度
仮設落石防護柵			落石防護設置 県道規制	県道片側交互規制

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山
