

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
6月
vol. 7

工事状況等

【進捗状況】

県道側で工事に支障となる既設ブロック積擁壁の撤去作業などを行っています。また、場内においてはトンネル工事用の基地造成のための切土工事も進めています。切土工事とともに発生土は三郷町に運搬しています。発生土運搬のダンプ台数は往復100台/日程度で行っています。

【今月の予定】


今月も引き続きトンネル工事用の基地造成作業を進めていきます。発生土運搬も往復100台/日程度で行っていきます。

造成工事の進捗に伴い、県道側に落石等が発生しないように仮設の落石防護柵を設置します。落石防護柵の設置作業のため、6月は断続的に県道の片側交互規制を実施させていただきます。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

6/20～6/22に、トンネル掘削作業時の発生土運搬台数を想定したダンプの試験走行を行い、周辺交通への影響確認を行います。この3日間は普段よりダンプの台数が増加します。安全運転で運行しますのでどうぞよろしくお願いいたします。



県道側擁壁取壊し状況

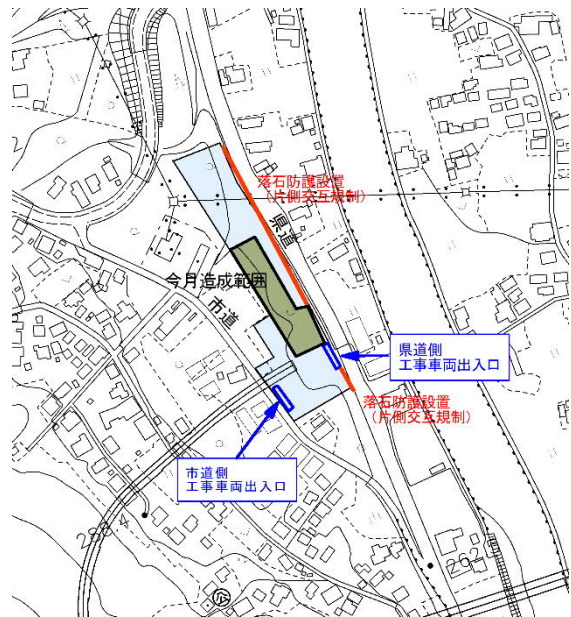

工事工程

工事内容	5月	6月	7月	備考
ヤード造成	切土			
発生土運搬	100台 (往復)			R5年度 1日最大100台 (往復)
仮囲工	仮囲い設置 市道規制			市道片側交互規制1日程度
仮設落石防護柵		落石防護設置 県道規制		6月：県道片側交互規制有

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026 担当：小山
