

# 中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年  
**7**月  
vol. 8

## 工事状況等

### 【進捗状況】

トンネル工事用のヤード造成のための切土工事を行っています。切土工事にとまなう発生土は山岡町に運搬しています。発生土運搬のダンプ台数は往復 100 台/日程度で行っています。

6月2日の台風による豪雨の際は、現場内の既設水路に降雨による大量の雨水が流入して越流し、現場前の県道等に雨水が流出してしまいました。周辺にお住まいの方々をはじめ地域の皆様には大変なご迷惑をおかけしました。当該水路については、同じことが起きないように、早急に補強工事を行いました。




水路補強工事完了

### 【今月の予定】

今月も引き続きトンネル工事用のヤード造成作業を進めていきます。発生土運搬も往復 100 台/日程度で行っていきます。

7月上旬には県道沿いに仮設の落石防護壁を設置します。この作業のため、県道の片側交互規制を実施させていただきます。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

また、7月下旬からは現場北側の未伐採範囲の伐採作業も行っていきます。

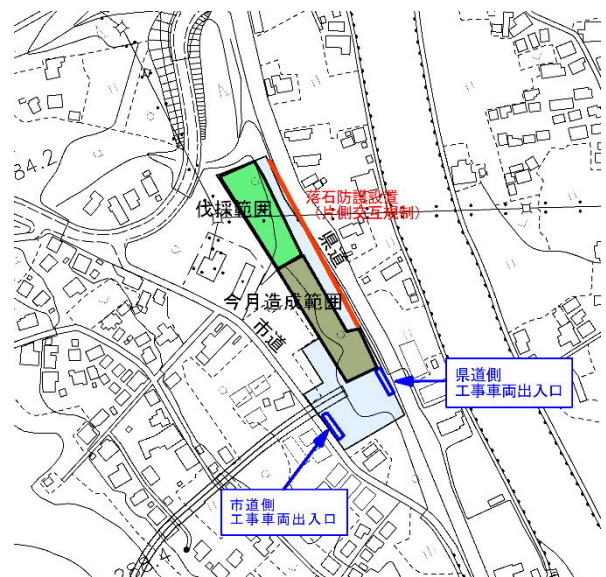

### 工事工程

工事内容	6月	7月	8月	備考
伐採工			北側伐採	
造成工（切土工）	切土			
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）
仮囲工	仮囲い設置			市道片側交互規制1日程度
仮設落石防護柵		落石防護設置 県道規制		7月：県道片側交互規制有

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1  
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
