

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
8月
vol. 9

工事状況等

【進捗状況】

工事ヤードの県道側に、造成作業時の安全対策として、仮設落石防護柵を設置しました。この防護柵の設置により、歩道が今までより若干狭くなっております。歩道を通行の際はご不便をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。現場内ではトンネル工事施工ヤードの造成のための切土工事を行っています。切土工事とともに発生する残土は、往復100台/日にて山岡町に運搬しています。また、7月下旬より、ヤード北側部分の伐採作業も行っています。




仮設落石防護柵設置完了

【今月の予定】

引続き伐採作業とヤード造成のための切土工事を行います。発生土運搬も往復100台/日程度で行います。

この時期は大雨による土砂災害に特に注意し、現場内の排水路の整備等を行います。

お盆の休工は8/12～8/20を予定しています。

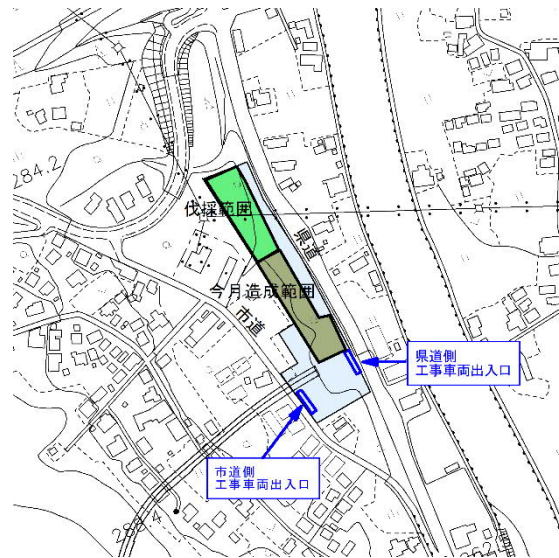

工事工程

工事内容	7月	8月	9月	備考
伐採工		北側伐採		
造成工（切土工）	切土			
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）
仮囲工	仮囲い設置			
仮設落石防護柵	落石防護設置 県道規制			7月：県道片側交互規制

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
