

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
9月
vol. 10

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。切土工事にともなって発生する残土は、往復100台/日にて山岡町にダンプ運搬しています。また8月に予定していたヤード北側部分の伐採は、作業計画の見直しにより延期しております。

その他作業として、現場周辺の仮囲いパネルや工事車両出入口ゲートの設置などを行いました。




大井非常口ヤード全景

【今月の予定】

引続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も往復100台/日にて行う予定です。小中学校の夏休みも終わりで、児童生徒さんの登下校がまた始まりますので、引続きダンプ運行時の交通安全に特に留意して作業を行います。

また、台風の発生しやすい時期ですので、今後も引続き現場内の排水対策を適切に行いながら工事を進めていきます。

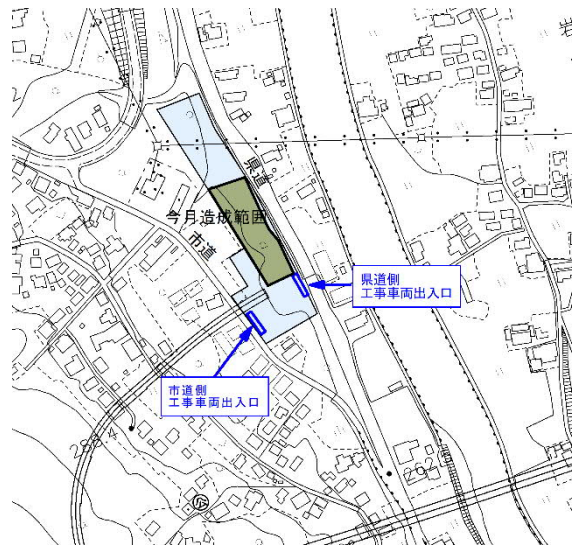

工事工程

工事内容	8月	9月	10月	備考
伐採工			■■■■	作業時期調整中
造成工	■■■■	■■■■		切土 伐採作業完了後再開
発生土運搬	100台(往復)	100台(往復)		R5年度 1日最大100台(往復) 伐採作業完了後再開
仮囲工	仮囲い設置			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
