

# 中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年  
**11**月  
vol. 12


## 工事状況等

### 【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、往復100台/日にて山岡町にダンプ運搬しています。

また、ヤード北側部分において一部伐採作業を行いました。

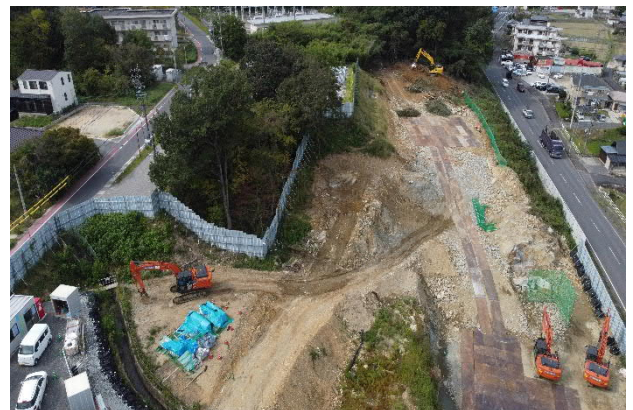


大井非常口ヤード全景

### 【今月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。ブレーカーによる岩掘削を行いますので、隣接する県道への飛石等を発生させないように、防護ネットを使用しながら工事を進めます。

発生土ダンプ運搬は今月も往復100台/日にて行う予定です。現場からのダンプの出入りの際は、交通誘導員を配置して左右の安全をしっかりと確認して出入りするようになります。

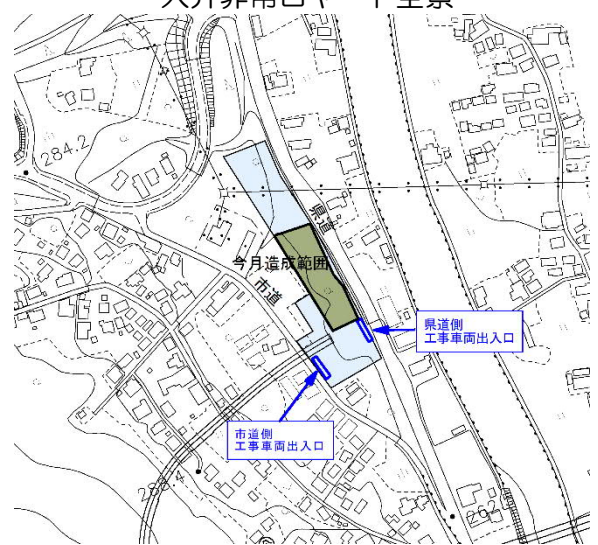

## 工事工程

工事内容	10月	11月	12月	備考
伐採工	■			
造成工	■	切土	■	
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）
仮囲工		■		

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
