

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
12月
vol. 13

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。

切土工事に伴って発生する土は、11月後半より往復100台/日にて山岡町にダンプ運搬しています。

また、ヤード北側部分において仮囲いの設置を行いました。




【今月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も往復100台/日にて行う予定です。朝晩が冷え込んできて、道路面の凍結が予想されるため、全車両のスタッドレスタイヤを装着させ、スリップ事故の防止に努めます。また、小中学校は冬休みに入りますので、ダンプ運行時の交通安全についても引き続き留意して作業を行います。

年末年始の休工は12/29～1/8までです。

大井非常口ヤード全景

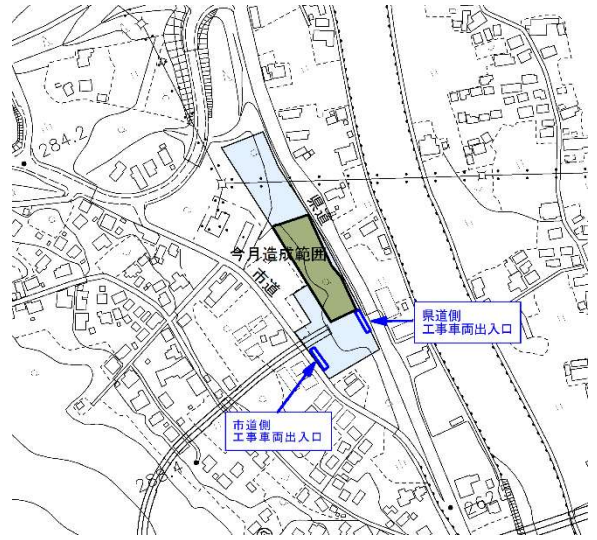

工事工程

工事内容	11月	12月	1月	備考
造成工	切土			
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
