

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2025年
5月
vol. 30

工事状況等

【進捗状況】（4/17時点）

トンネル工事施工ヤードを造成するための水路付替え工事を施工中のほか、ヤード内での切土工事を行っております。切土工事にともなって発生する土は、最大で往復100台/日にて三郷町にダンプ運搬しています。

水路付替え工事は古い水路から新しい水路への切替えを行いました。

施工ヤード①において、新しい水路周りの埋戻し作業を行っています。

施工ヤード②において、新しい水路周りの埋戻し作業や古い水路の撤去作業を行っています。



大井非常口ヤード全景（写真）

【5月の予定】

5月中旬頃まで、工事ヤード①②において新しい水路周りの埋戻しや仕上げ作業を行います。

また、5月全体を通して工事ヤード①にてヤード造成のための切土工事を行います。


発生土ダンプ運搬は場外運搬が発生した場合、最大で往復100台/日で行う予定です。

ゴールデンウィーク期間の工事休工は4/27～5/6を予定しております。

切土工事では、低騒音型機械の使用や飛石対策ネットの配置により、周辺環境に配慮しながら作業を行ってまいります。

また、発生土ダンプ運搬においては交通ルールの遵守徹底にて運搬を行ってまいります。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

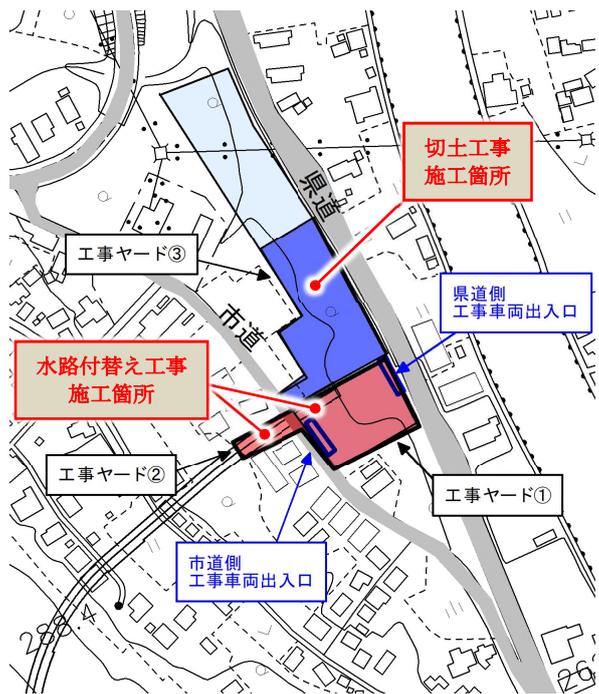

大井非常口ヤード全景（模式図）

【工事工程】

工事内容	R7.4月	R7.5月	R7.6月	備考
造成工	・水路付替、各所埋戻し (ヤード西側)	・切土工	・切土工	
発生土運搬	100台(往復)	100台(往復)	100台(往復)	

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026

担当：小山
