

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2025年
6月
vol. 31

工事状況等

【進捗状況】（5/19時点）

トンネル工事施工ヤードを造成するための水路付替え工事を施工中のほか、ヤード内での切土工事を行っています。今回の期間における、切土工事にもなう場外搬出は発生していないため、三郷町へのダンプ運搬は行っていません。

- 施工ヤード①②において、新しい水路周りの埋戻しや仕上げ作業を行っています。
- 施工ヤード③において、切土作業を行っています。

【6月の予定】


6月全体を通して、工事ヤード①③にてヤード造成のための切土工事を行います。
発生土ダンプ運搬は場外運搬が発生した場合、最大で往復100台/日で行う予定です。

切土工事では、低騒音型機械の使用や飛石対策ネットの配置により、周辺環境に配慮しながら作業を行います。
また、発生土ダンプ運搬においては交通ルールの遵守徹底にて運搬を行います。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き、安全と現場周辺への環境に配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



大井非常口ヤード全景（写真）

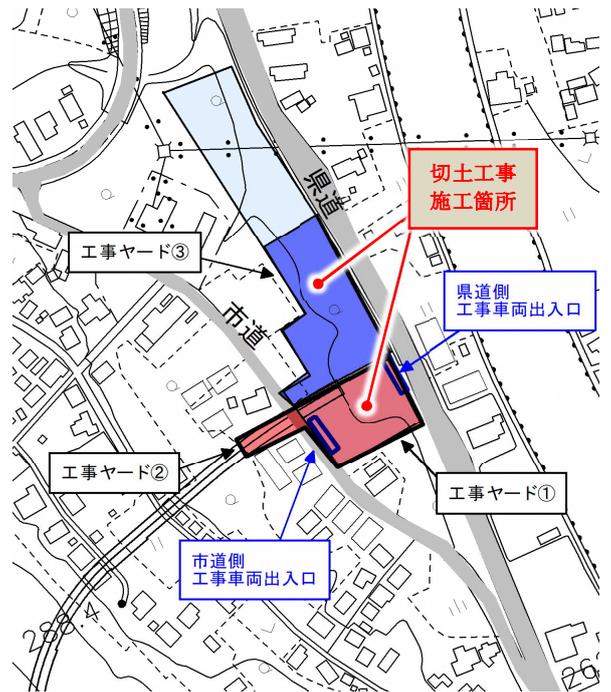

大井非常口ヤード全景（模式図）

【 工 事 工 程 】

工事内容	R7.5月	R7.6月	R7.7月	備考
造成工	・水路仕上げ、箇所埋戻し ・切土工	・切土工	・切土工	
発生土運搬		100台（往復）	100台（往復）	

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026

担当：小山
