

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2025年
8月
vol. 33

工事状況等

【進捗状況】（7／18時点）

トンネル工事施工ヤードを造成するための水路付替え工事を施工中のほか、ヤード内での切土工事をを行っています。当月期間における、切土工事ともなう場外搬出土は発生していないため、三郷町へのダンプ運搬は行っていません。

- ・工事ヤード①において、古い水路の撤去作業および重機作業用通路の造成を行っています。
- ・工事ヤード①において、切土工事をしています。

【8月の予定】


8月は、古い水路の撤去工事、およびヤード造成のための切土工事を、引き続き工事ヤード①にて行います。

低騒音型機械の使用や飛石対策ネットの配置により、周辺環境に配慮しながら作業を行います。


切土工事に伴うダンプ運搬が生じた場合、最大で往復100台／日で行う予定です。

夏季休工は、8／9～8／18を予定しています。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き、安全と現場周辺への環境に配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

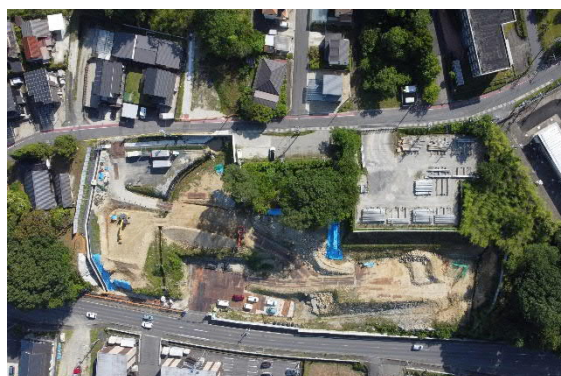

大井非常口ヤード全景（写真）

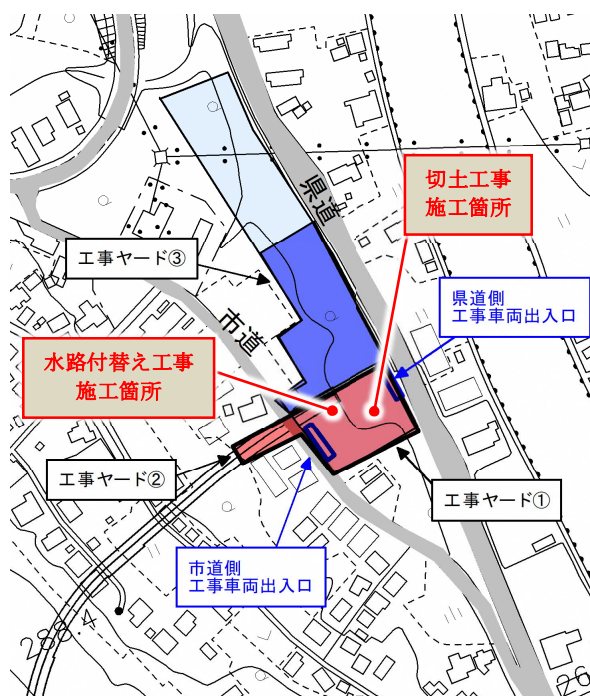

大井非常口ヤード全景（模式図）

【工事工程】

工事内容	R7.7月	R7.8月	R7.9月	備考
造成工	・切土工 ・既設水路撤去工	・切土工 ・既設水路撤去工	・切土工	
発生土運搬		100台（往復）	100台（往復）	

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1
電 話 0573-28-5026
担 当 小山
