

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2025年
10月
vol. 35

工事状況等

【進捗状況】（9／17時点）

トンネル工事施工ヤード内の造成を行っているほか、造成に伴い発生した岩塊を破砕する作業を、三郷町の盛土場にて行っています。

当月期間における、場外搬出土は発生していないため、三郷町へのダンプ運搬は行っていません。

【10月の予定】

10月は、水路付替え工事に伴う埋戻しやブロック積み擁壁の復旧を工事ヤード①にて行います。

ブロック積み擁壁の復旧工事を行う際、県道（歩道部）にて部分的に歩道規制（別紙1参照）を実施します（通行は可能なようにいたします）。


各工事にともない発生した場外搬出土のダンプ運搬が生じた場合、最大で往復100台／日で行う予定です。

また、トンネル工事施工ヤードを造成するに伴い発生した岩塊を破砕する作業を、三郷町の盛土場にて引続き行います。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き、安全と現場周辺への環境に配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



大井非常口ヤード全景（写真）

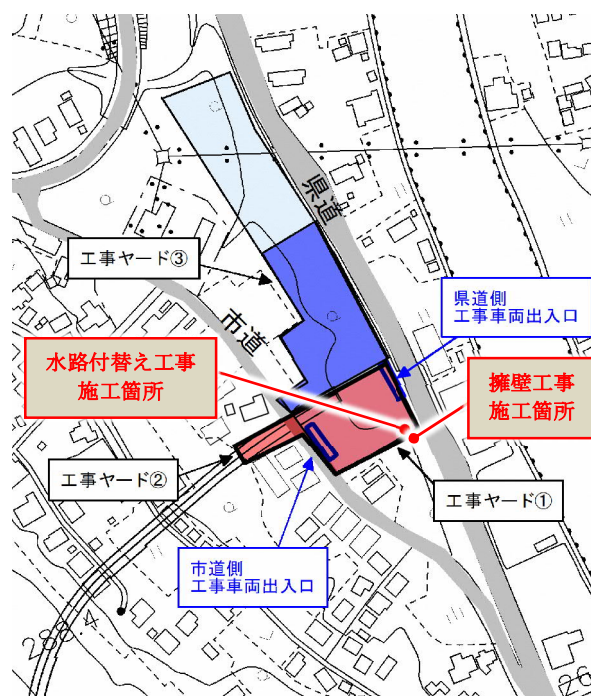

大井非常口ヤード全景（模式図）

【工事工程】

工事内容	R7.9月	R7.10月	R7.11月	備考
造成工	・発生土破砕工 （三郷盛土場）	・擁壁工	・擁壁工	
発生土運搬		100台（往復）	100台（往復）	

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026

担 当 小山

● 県道側（工事ヤード際）にて行う歩道規制について（県道72号_歩道規制 計画図）

規制期間・・・令和7年10月1日～10月31日



（先の内、土日を除く15日間程度）

規制時間帯・・・8：00～17：00

※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

※作業の進捗により前後する場合があります。

・上記規制時間帯以外は、通常通りご通行いただけます。

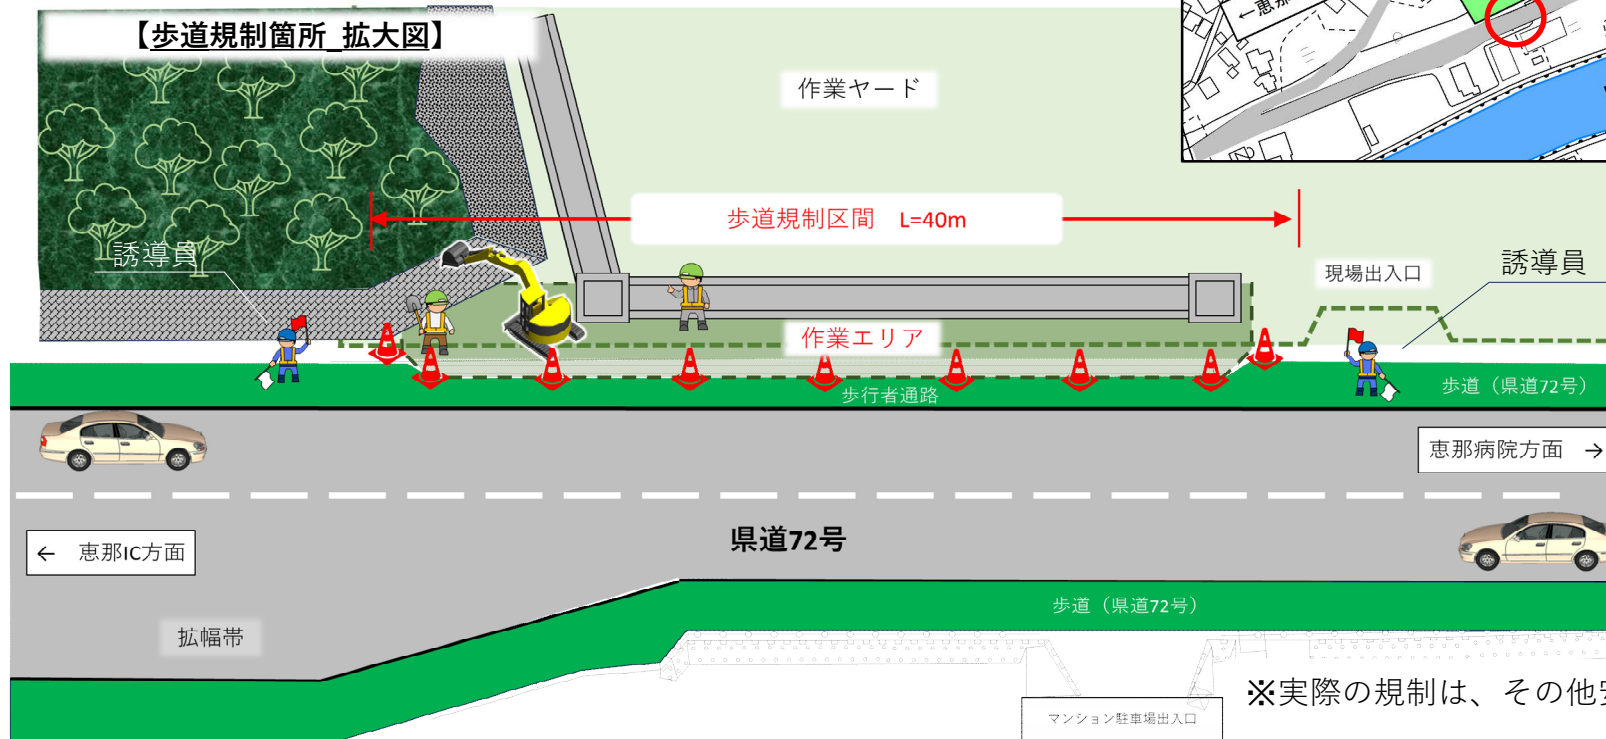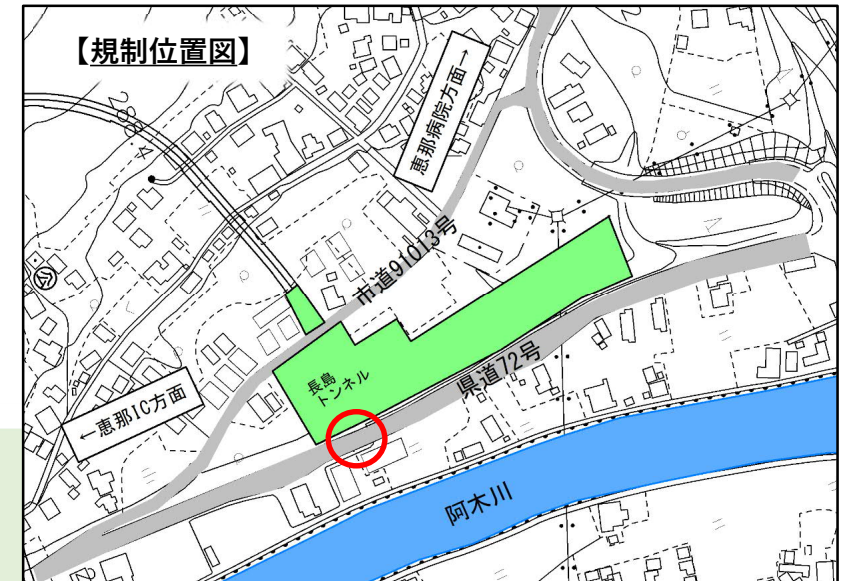

※実際の規制は、その他安全設備等を設置します。
