

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2025年
11月
vol. 36

工事状況等

【進捗状況】（10/17時点）

トンネル工事施工ヤード内の造成に伴い発生した岩塊を破砕する作業を、三郷町の盛土場にて行いました。

なお、当月期間において三郷町へのダンプ運搬は行っていません。

【11月の予定】

11月は、ブロック積み擁壁の復旧や水路付替え工事に伴う埋戻しを工事ヤード①にて行います。

（※関係機関と協議・調整中）


ブロック積み擁壁の復旧工事を開始した場合、県道（歩道部）にて部分的に歩道規制（別紙1参照）を実施します（通行は可能なようにいたします）。

各工事とともに発生した場外搬出土のダンプ運搬が生じた場合は、最大で往復100台/日で行う予定です。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き、安全と現場周辺への環境に配慮して整備を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



大井非常口ヤード全景（写真）

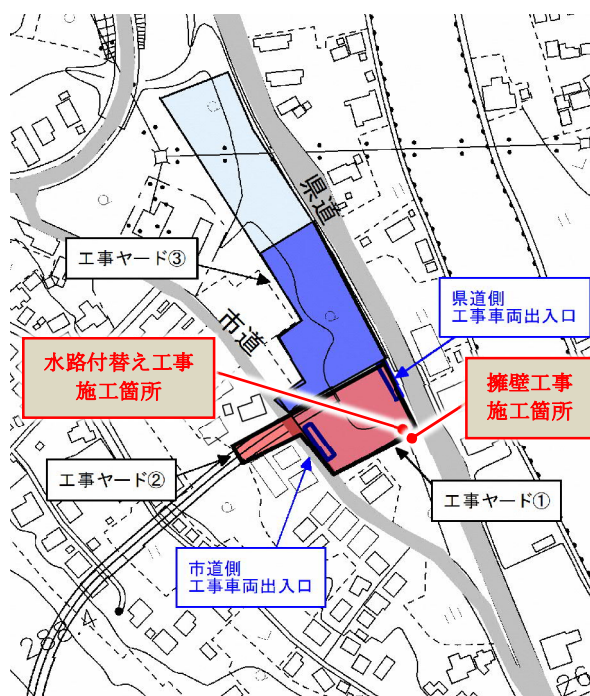

大井非常口ヤード全景（模式図）

【工事工程】

工事内容	R7.10月	R7.11月	R7.12月	備考
造成工・付替え水路工	・発生土破砕工 （三郷盛土場）	・擁壁復旧工 ・埋戻し	・擁壁復旧工 ・埋戻し	
発生土運搬		100台（往復）	100台（往復）	

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026

担 当 小山

● 県道側（工事ヤード際）にて行う歩道規制について（県道72号_歩道規制 計画図）

規制期間・・・令和7年11月1日～11月30日



（先の内、土日を除く15日間程度）

規制時間帯・・・8：00～17：00

※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

※作業の進捗により前後する場合があります。

・上記規制時間帯以外は、通常通りご通行いただけます。

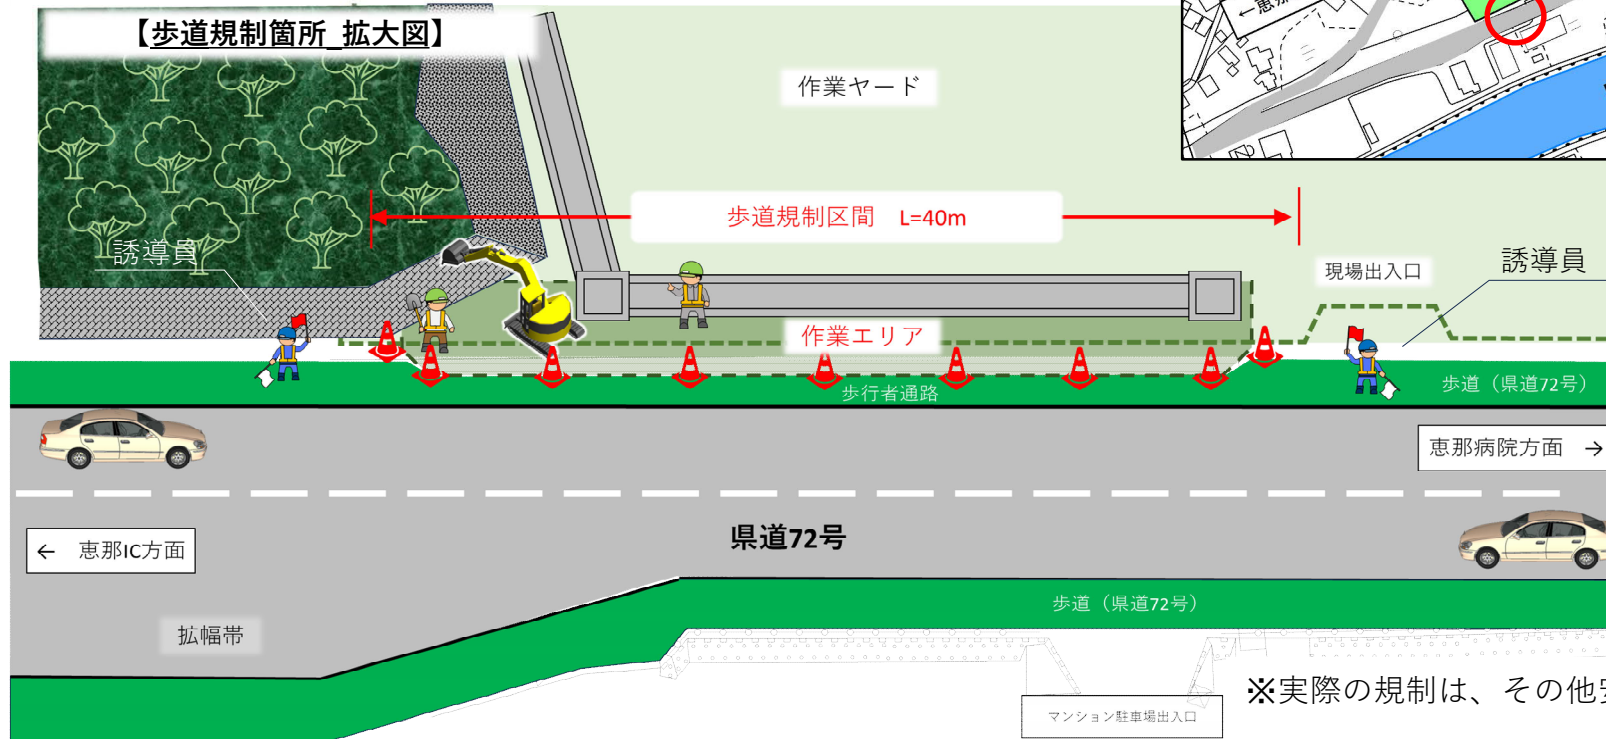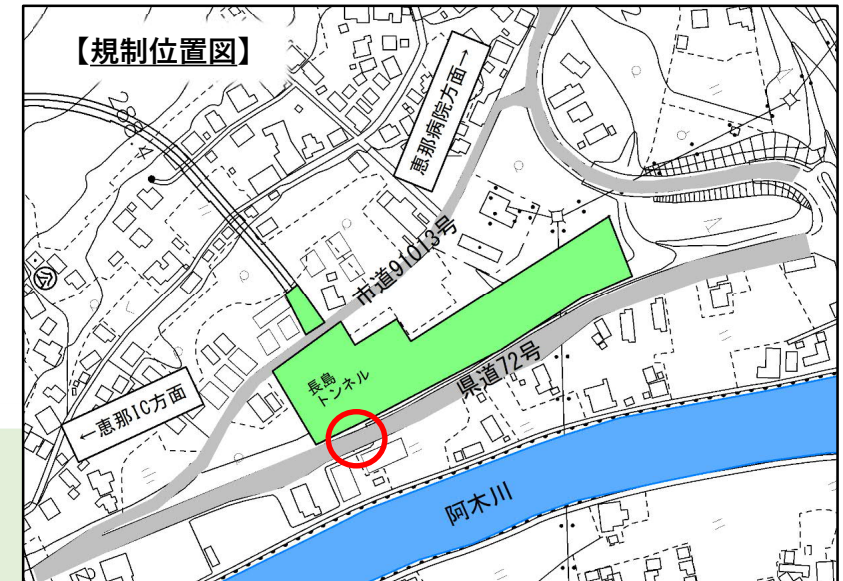

※実際の規制は、その他安全設備等を設置します。
