

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2026年
1月
vol. 38

工事状況等

【進捗状況】（12/8時点）

トンネル工事施工ヤード内の造成を行っています。

当月期間における、場外搬出土は発生していないため、三郷町へのダンプ運搬は行っていません。

【1月の予定】

1月は、ヤード造成工に伴う仮設備の設置や水路付替え工事に伴う水路整備をヤード①にて行います。

ヤード造成工に伴う仮設備設置を開始した場合、県道にて歩道規制（通行止め）および車道規制（片側交互通行）（別紙1参照）を実施します（歩行者の方は迂回していただくようにご協力をお願いいたします）。

各工事にともない発生した場外搬出土のダンプ運搬が生じた場合は、最大で往復100台/日で行う予定です。


地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き、安全と現場周辺への環境に配慮して整備を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

【その他】

年末年始の休工は12/27（土）～1/5（月）を予定しております。（保守管理等に関する人の出入りはあります。）



大井非常口ヤード全景（写真）

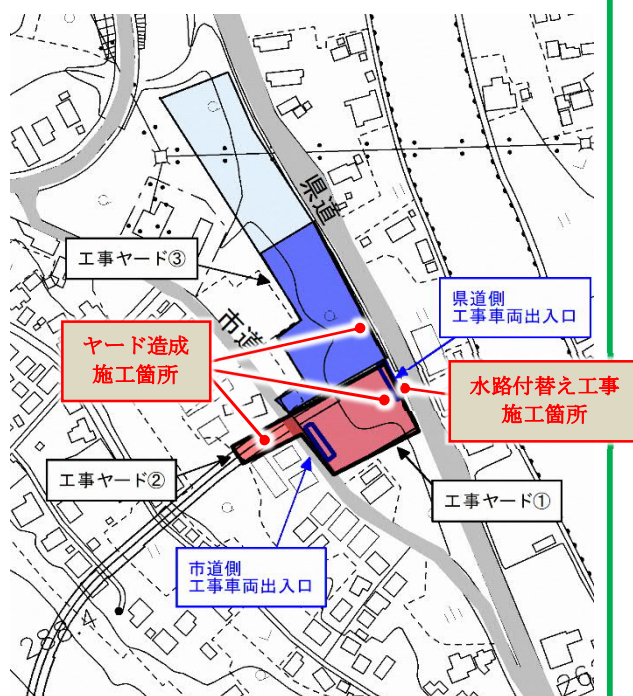

大井非常口ヤード全景（模式図）

【工事工程】

工事内容	R7.12月	R8.1月	R8.2月	備考
造成工・付替え水路工	・ヤード造成 ■	・ヤード造成 ・付替え水路工 ■	・ヤード造成 ・付替え水路工 ■	
発生土運搬		100台（往復） ■	100台（往復） ■	

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026

担当 小山

● 県道側（工事ヤード際）にて行う車道・歩道規制について
（県道72号_車道・歩道規制 計画図）

規制期間・・・令和8年1月7日～2月28日

（先の内、土日を除く21日間程度）

規制時間帯・・・8：00～17：00

※規制開始1週間前には予告看板を設置する予定です。

※作業の進捗により前後する場合があります。

※歩道のみの規制となる場合があります。

・上記規制時間帯以外は、通常通りご通行いただけます。

