



中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2026年

8月

vol. 45

工事状況等（大井非常口ヤード）

【進捗状況】（7/17時点）

7月は、ヤード造成工における切土掘削工事を行いました。これに伴い、発生土の場外搬出を行っております（最大往復100台/日）。

【8月の予定】

8月は、引き続きヤード造成工における切土掘削工事をヤード①③にて行います。

工事に伴い発生した場外搬出土のダンプ運搬が生じた場合は、県道側工事車両出入口より最大で往復100台/日※で行う予定です。


※最大ダンプ運搬台数は、大井非常口ヤードおよび裏面記載の道路付替え工事における阿木川ヤードからのダンプ台数の合計です。

夏季休工は8/8～8/17を予定しておりますが、現場内の点検・巡回のため、作業員の通勤車両などが数台程度出入りいたします。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き、安全と現場周辺への環境に配慮して整備を進めてまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。



大井非常口ヤード全景（写真）

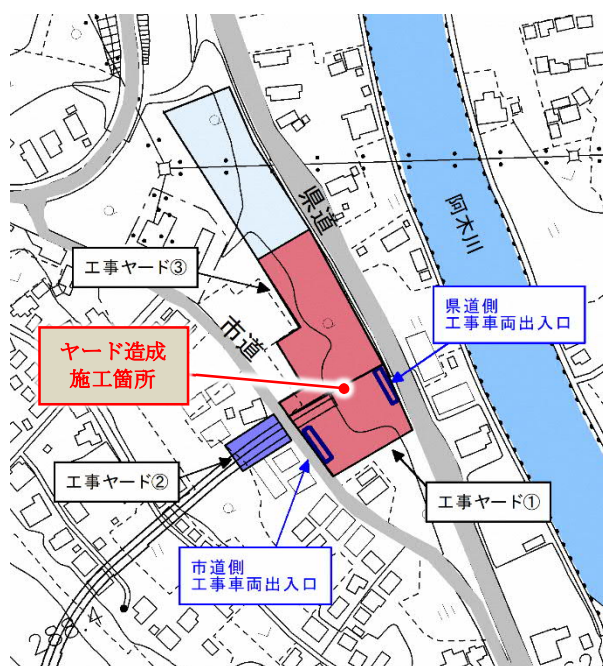

大井非常口ヤード全景（模式図）

【工事工程】

工事内容	R8.7月	R8.8月	R8.9月	備考
大井非常口造成工	・ヤード造成	・ヤード造成	・ヤード造成	
付替え道路工	・仮設 ・伐採	・仮設 ・掘削 ・伐採	・掘削	
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	大井非常口ヤードおよび阿木川ヤードの合算台数

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026

担 当 小山



中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2026年
8月
vol. 45

工事状況等（市道 01171 号線道路付替え工事）

【進捗状況】（7／17時点）

7月は、市道ヤードにて仮設工事、伐採工事および既設家屋基礎解体工事を行いました。また、阿木川ヤードにてヤード造成工事を行いました。

【8月の予定】

市道ヤードにて仮設工事、伐採工事および切土掘削工事を行います。また、阿木川ヤードにてヤード造成工事を行います。

工事に伴い発生した場外搬出は、阿木川ヤードに一度集積し、同ヤードから最大で往復100台／日※でダンプ運搬を行う予定です。


※最大ダンプ運搬台数は、裏面記載の大井非常口ヤードおよび図中の阿木川ヤードからのダンプ台数の合計です。

夏季休工は8／8～8／17を予定しておりますが、現場内の点検・巡回のため、作業員の通勤車両などが数台程度出入りいたします。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き、安全と現場周辺への環境に配慮して整備を進めてまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。



市道 01171 号線道路付替え工事ヤード
全景（写真）

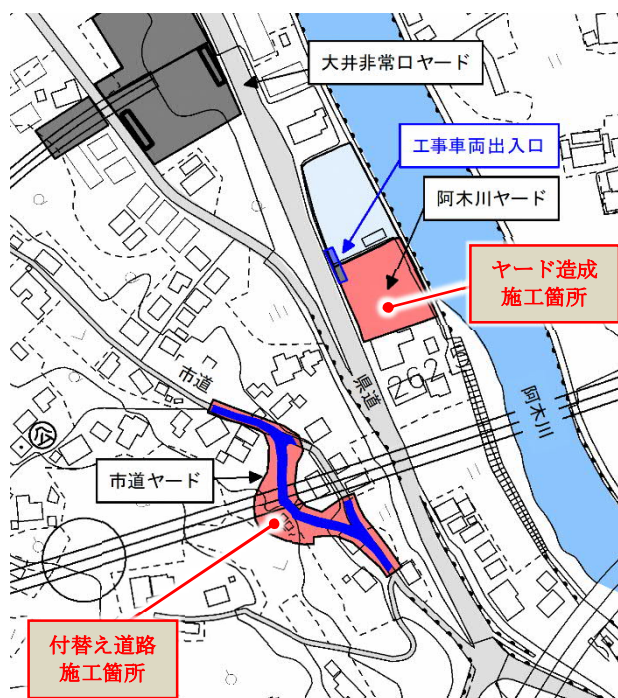

付替え道路施工ヤード全景（模式図）

【工 事 工 程】

工事内容	R8.7月	R8.8月	R8.9月	備考
大井非常口造成工	・ヤード造成	・ヤード造成	・ヤード造成	
付替え道路工	・仮設 ・ヤード造成 ・伐採	・仮設 ・掘削 ・伐採	・掘削	
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	大井非常口ヤードおよび阿木川ヤードの合算台数

※工程や作業内容は、工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1
電 話 0573-28-5026
担 当 小山
