

# 中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年  
**8**月  
vol. 21


## 工事状況等

### 【進捗状況】（7.19時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っています。

水路の付替え工事にもなって発生する土は、施工ヤード内に仮置きしたため三郷町へダンプ運搬は行っていません。

先月度の工事だよりにてお知らせいたしました県道の片側交互規制につきましては、工事の進捗により延期いたします。

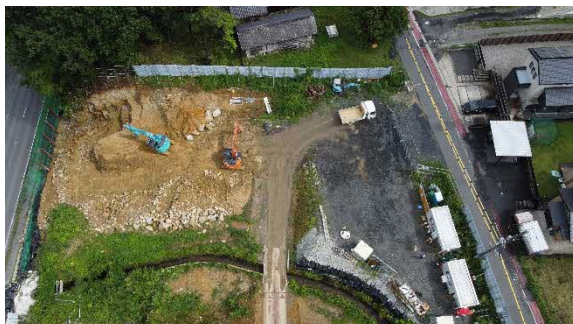

大井非常口ヤード南側

### 【8月の予定】


引き続き施工ヤード南側の水路付替え工事を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

また、7月下旬から8月上旬にかけて行う計画であった県道の片側交互規制は、工事の進捗により9月中旬ごろを予定しております。規制の詳細につきましては、次号の工事だよりにてお知らせさせていただきます。

夏季休工につきましては、8/10～8/19を予定しております。

引き続き現場周辺への環境にも配慮して作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、時期は未定ですが、非常口トンネル（斜坑）掘削（発破にて掘削することを考えています）を行う際は、改めて事前にお知らせさせていただきます。近隣にお住まいの方々に発破掘削についてのご理解を頂くため、別途ご説明をさせていただきたいと思っております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

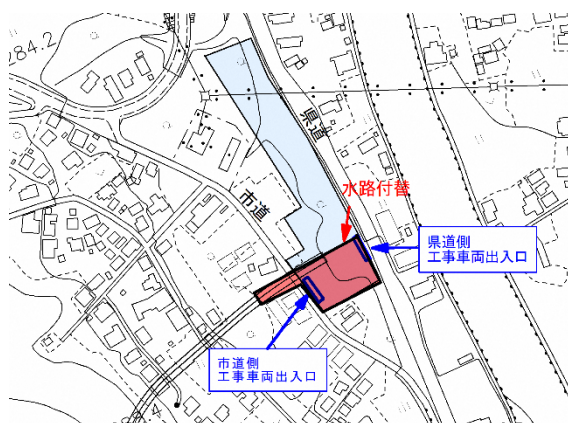

## 工事工程

| 工事内容           | 7月                | 8月                | 9月                | 備考        |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 造成工            | ・水路付替え<br>（ヤード南側） | ・水路付替え<br>（ヤード南側） | ・水路付替え<br>（ヤード南側） |           |
| 発生土運搬          | 運搬なし              | 100台（往復）          | 100台（往復）          |           |
| 片側交互規制<br>（県道） |                   |                   | 県道規制<br>■■■■      | 落石防護柵の撤去等 |

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1  
電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
