

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
1 月
vol. 2

工事状況等

【進捗状況】12.13 時点

12月5日より工事施工ヤードの市道側の一部の伐採作業を行いました。

【今月の予定】

12月に伐採した範囲の整地作業を行います。整地作業に伴い市道側より重機の搬入を行います。朝の通勤時間を避けて行います。整地作業中は重機が稼働しており危険ですので工事現場内へは立ち入らないようお願いいたします。

また、2月より県道側の伐採作業を行います。伐採作業に伴い県道の片側交互規制を実施させていただきます。県道規制作業の詳細は別途2月の回覧にてお知らせいたします。また現地にも規制予告看板を設置して事前に周知いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。


【工事工程】

工事内容	12月	1月	2月	備考
伐採工	市道側伐採 ■		県道側伐採 ■	2月：県道片側交互規制あり
ヤード整備		市道側整地 ■		

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。



伐採作業状況

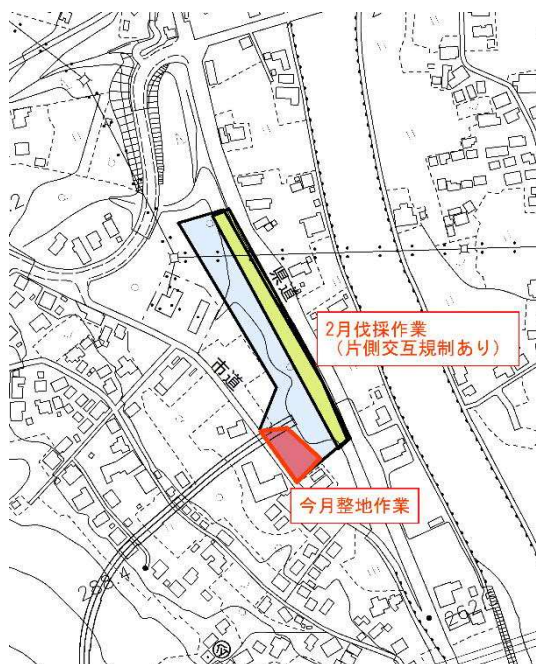

平面図

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026

担当：小山

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
2月
vol. 3

工事状況等

【進捗状況】 1.23 時点

ヤードの市道側部分の整地作業を行っています。

【今月の予定】

2月はヤード内の伐採作業を行います。県道沿いの斜面の伐採を行う際は、道路の片側交互規制を実施させていただきます。片側交互規制は2月13日から3月4日までの3週間（日曜日を除く）の予定で、規制時間帯は9：00～17：00となります。歩行者通路は規制中も確保します。また現地には規制予告看板を事前に設置いたします。ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。


【工事工程】

工事内容	1月	2月	3月	備考
伐採工		伐採工 県道規制		2/13～3/4 県道片側交互規制
ヤード整備	市道側整地		ヤード造成	

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。



整地作業状況

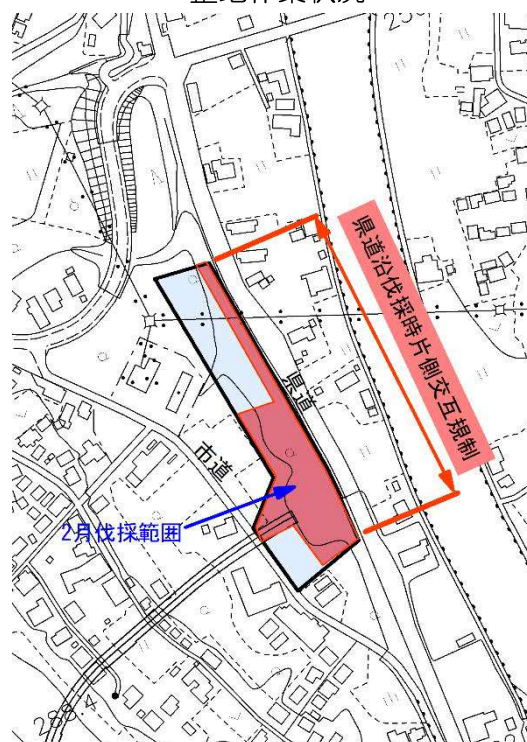

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026 担当：小山

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
3月
vol. 4

工事状況等

【進捗状況】

ヤード内の伐採作業を行っています。県道沿いの斜面の伐採にあたっては、道路の片側交互規制を行いながら作業しています。

また、現在使用している市道側の工事関係車両出入口について、交通事故防止のための追加安全対策として、交通誘導員の配置、より見通しの良い箇所への出入口移設、注意喚起看板の設置などを実施しています。

【今月の予定】

3月中旬ごろまで引き続き伐採作業を行います。伐採作業に伴う片側交互規制は3月11日までを予定しています。規制時間は9：00～17：00となります。歩行者通路は規制中も確保します。


ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

伐採工事が完了した後は、県道側の工事車両出入口を設置するための造成を行います。出入口設置工事にともない4月中旬にも再度県道の片側交互規制を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。

県道側出入口の完成後の4月中旬以降に、造成にともなう発生土の場外運搬を開始します。発生土運搬のダンプトラックは全て県道側から出入りし、市道側からは出入りいたしません。



伐採作業状況

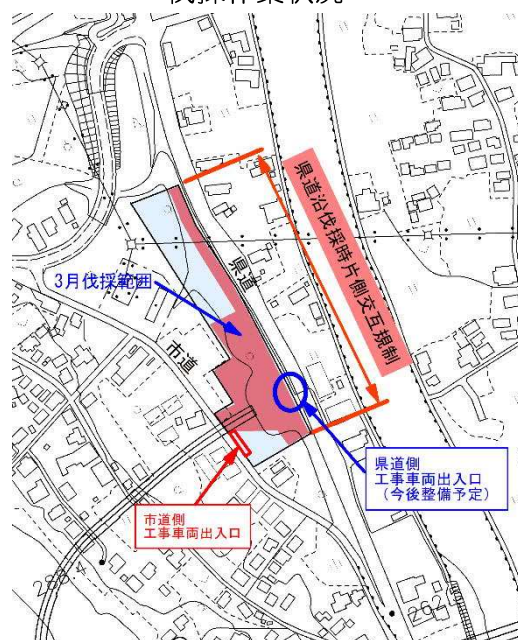

平面図

工事工程

工事内容	2月	3月	4月	備考
伐採工	伐採工 県道規制			2/20～3/11 県道片側交互規制
ヤード造成		県道側出入口整備 県道規制	4月中旬県道片側交互規制 1週間程度	
発生土運搬		三郷発生土置場		

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1
電 話 0573-28-5026 担当：小山

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
4 月
vol. 5

工事状況等

【進捗状況】

ヤード内の伐採作業を行いました。県道側の伐採においては、道路の片側交互規制ご協力をいただき、ありがとうございました。

伐採に引き続き県道側の工事車両出入口の整備を行っています。


【今月の予定】

4月中旬ごろまで県道側の工事車両出入口整備の作業を行います。この作業の関係で、4月10日から4月15日頃（※工事の進捗等により変更となる場合があります）まで再び県道の片側交互規制を実施させていただきます。規制時間は9:00～17:00 までとなります。歩行者通路は確保します。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

県道側の工事車両出入口の整備が終わりましたら、準備が整いしだい発生土のダンプ運搬を開始いたします。ダンプ運搬は往復 100 台/日程度にて行う予定です。（状況により5月以降の運搬開始となる可能性があります）発生土運搬にあたっては、交通マナーをしっかりと守って運行いたしますのでよろしくお願いいたします。



県道側伐採作業状況

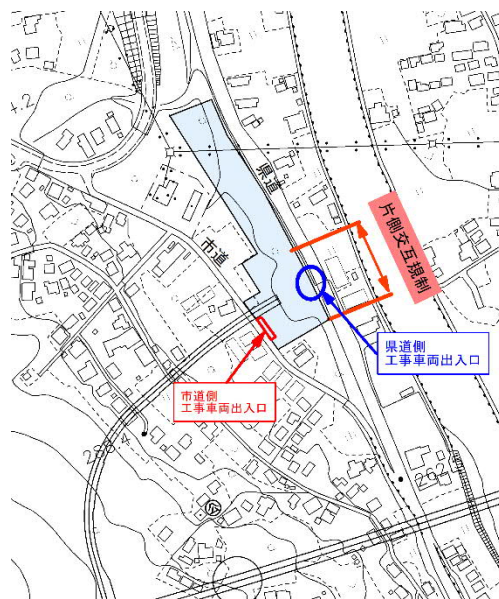

工事工程

工事内容	3月	4月	5月	備考
伐採工	伐採工			
ヤード造成	県道側出入口整備 切土			4/10～4/15 県道片側交互規制
発生土運搬		100台（往復）		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
5 月
vol. 6

工事状況等

【進捗状況】

県道側の工事車両出入口の整備工事を行いました。工事車両出入口の完成により、4月下旬からは造成工事で発生する残土のダンプ運搬も開始しています。発生土運搬のダンプ台数は往復100台／日程度で行っています。

【今月の予定】

今月も引き続きヤード内の造成工事を行います。発生土運搬も往復100台／日程度で行っていきます。発生土運搬のダンプは全て県道側から出入りします。ダンプの出入口には交通誘導員を配置し、歩行者及び一般車両との接触事故がないよう安全確認をしっかりと行って出入りします。


また、ヤード外周の仮囲いの設置作業を行います。この作業の関係で5月中旬に市道の片側交互規制を1日程度予定しています。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

その他作業として、県道沿いの既設ブロック積擁壁の取り壊し作業も行います。県道に対する飛散防止等の安全対策をしっかりと行って作業します。

ゴールデンウィークの休工は4/29～5/7となります。



県道側工事車両出入口

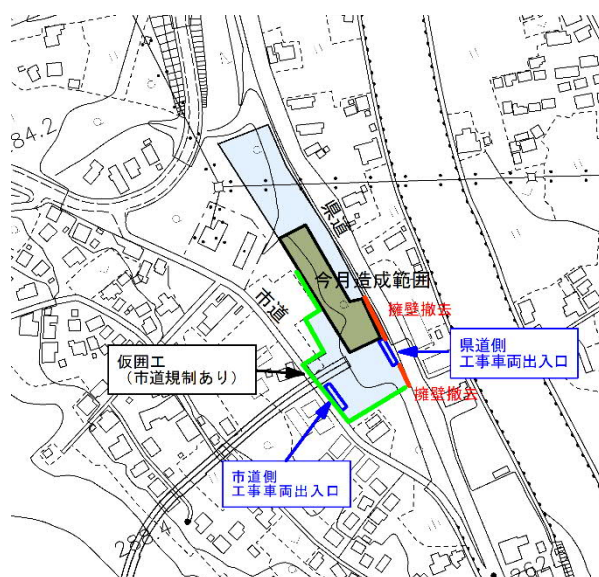

工事工程

工事内容	4月	5月	6月	備考
ヤード造成	県道側出入口整備 切土			
発生土運搬	100台 (往復)			R5年度 1日最大100台 (往復)
仮囲工		仮囲い設置 市道規制		市道片側交互規制1日程度
仮設落石防護柵			落石防護設置 県道規制	県道片側交互規制

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
6 月
vol. 7

工事状況等

【進捗状況】

県道側で工事に支障となる既設ブロック積擁壁の撤去作業などを行っています。また、場内においてはトンネル工事用の基地造成のための切土工事も進めています。切土工事にともなう発生土は三郷町に運搬しています。発生土運搬のダンプ台数は往復 100 台／日程度で行っています。

【今月の予定】


今月も引き続きトンネル工事用の基地造成作業を進めていきます。発生土運搬も往復 100 台／日程度で行っていきます。

造成工事の進捗に伴い、県道側に落石等が発生しないように仮設の落石防護柵を設置します。落石防護柵の設置作業のため、6月は断続的に県道の片側交互規制を実施させていただきます。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

6/20～6/22 に、トンネル掘削作業時の発生土運搬台数を想定したダンプの試験走行を行い、周辺交通への影響確認を行います。この3日間は普段よりダンプの台数が増加します。安全運転で運行しますのでどうぞよろしくお願いいたします。



県道側擁壁取壊し状況

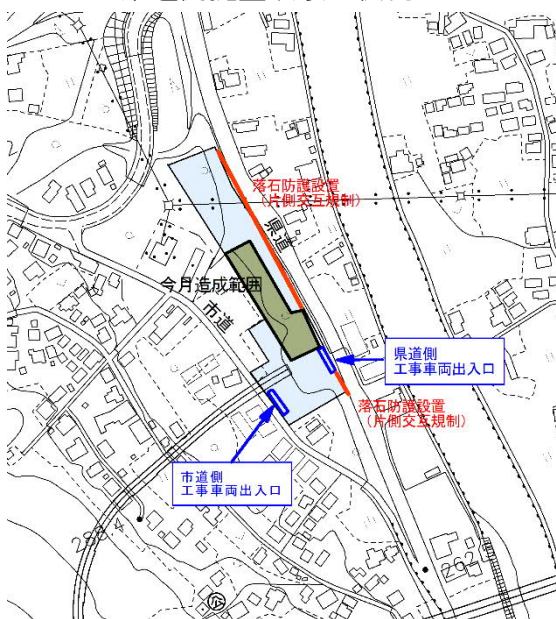

工事工程

工事内容	5月	6月	7月	備考
ヤード造成	切土			
発生土運搬	100台 (往復)			R5年度 1日最大100台 (往復)
仮囲工	仮囲い設置 市道規制			市道片側交互規制1日程度
仮設落石防護柵		落石防護設置 県道規制		6月：県道片側交互規制有

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026 担当：小山

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
7 月
vol. 8

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事用のヤード造成のための切土工事を行っています。切土工事にともなう発生土は山岡町に運搬しています。発生土運搬のダンプ台数は往復 100 台／日程度で行っています。

6 月 2 日の台風による豪雨の際は、現場内の既設水路に降雨による大量の雨水が流入して越流し、現場前の県道等に雨水が流出してしまいました。周辺にお住まいの方々をはじめ地域の皆様には大変なご迷惑をおかけしました。当該水路については、同じことが起きないように、早急に補強工事を行いました。




水路補強工事完了

【今月の予定】

今月も引き続きトンネル工事用のヤード造成作業を進めていきます。発生土運搬も往復 100 台／日程度で行っていきます。

7 月上旬には県道沿いに仮設の落石防護壁を設置します。この作業のため、県道の片側交互規制を実施させていただきます。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

また、7 月下旬からは現場北側の末伐採範囲の伐採作業も行っていきます。

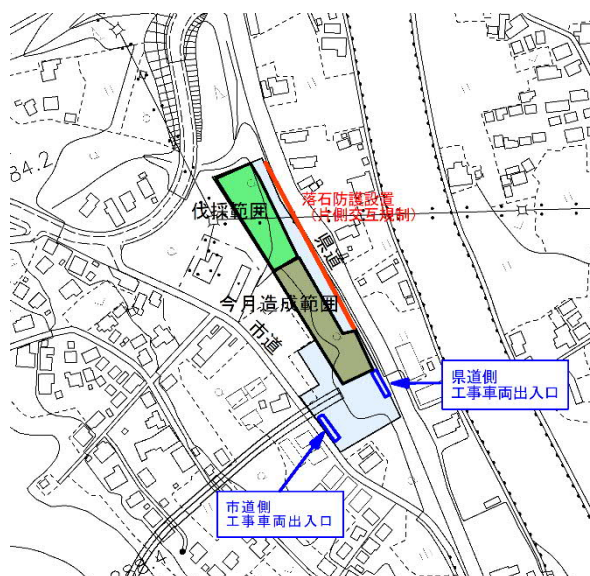

工事工程

工事内容	6月	7月	8月	備考
伐採工			北側伐採	
造成工（切土工）	切土			
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）
仮囲工	仮囲い設置			市道片側交互規制1日程度
仮設落石防護柵		落石防護設置 県道規制		7月：県道片側交互規制有

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
8 月
vol. 9

工事状況等

【進捗状況】

工事ヤードの県道側に、造成作業時の安全対策として、仮設落石防護柵を設置しました。この防護柵の設置により、歩道が今までより若干狭くなっております。歩道を通行の際はご不便をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。現場内ではトンネル工事施工ヤードの造成のための切土工事を行っています。切土工事に伴って発生する残土は、往復 100 台/日にて山岡町に運搬しています。また、7月下旬より、ヤード北側部分の伐採作業も行っています。




仮設落石防護柵設置完了

【今月の予定】

引続き伐採作業とヤード造成のための切土作業を行います。発生土運搬も往復 100 台/日程度で行います。

この時期は大雨による土砂災害に特に注意し、現場内の排水路の整備等を行います。

お盆の休工は 8/12～8/20 を予定しています。

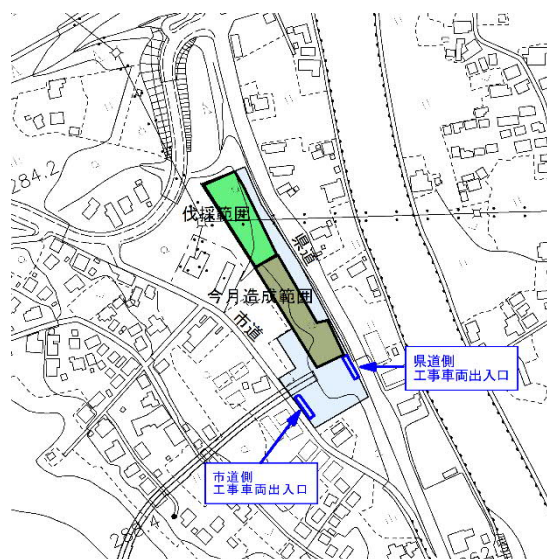

工事工程

工事内容	7月	8月	9月	備考
伐採工		北側伐採		
造成工（切土工）	切土			
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）
仮囲い設置	仮囲い設置			
仮設落石防護柵	落石防護設置 県道規制			7月：県道片側交互規制

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
9 月
vol. 10

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。切土工事にともなって発生する残土は、往復 100 台／日にて山岡町にダンプ運搬しています。また 8 月に予定していたヤード北側部分の伐採は、作業計画の見直しにより延期しております。

その他作業として、現場周辺の仮囲いパネルや工事車両出入口ゲートの設置などを行いました。




大井非常口ヤード全景

【今月の予定】

引続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も往復 100 台／日にて行う予定です。小中学校の夏休みも終わり、児童生徒さんの登下校がまた始まりますので、引続きダンプ運行時の交通安全に特に留意して作業を行います。

また、台風の発生しやすい時期ですので、今後も引続き現場内の排水対策を適切に行いながら工事を進めていきます。

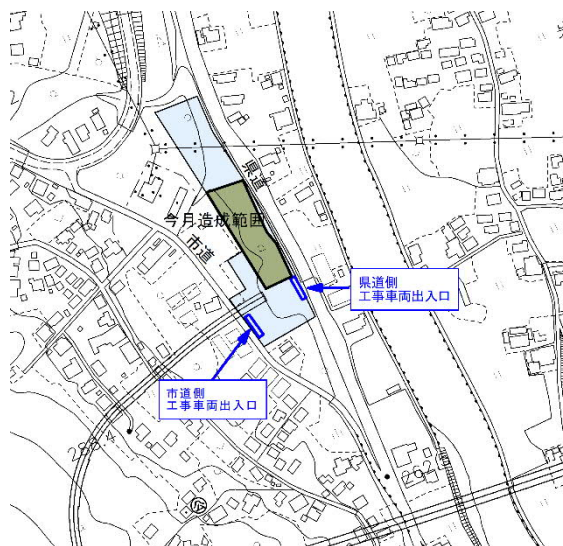

工事工程

工事内容	8月	9月	10月	備考
伐採工			■■■■■	作業時期調整中
造成工	■■■■■	切土		伐採作業完了後再開
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）		R5年度 1日最大100台（往復） 伐採作業完了後再開
仮囲工	仮囲い設置			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
10 月
vol. 11

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。掘削箇所に硬い岩盤が出現しており、ブレーカーを使用して掘削を進めています。

切土工事にともなって発生する土は、往復 100 台／日にて山岡町にダンプ運搬しています。




大井非常口ヤード全景

【今月の予定】

ヤード北側部分の一部で伐採作業を行います。また、引続きヤード造成のための切土作業を行います。ブレーカーによる岩の掘削作業においては、低騒音型機械の使用、飛び石対策ネットの使用等により、周辺環境に配慮しながら工事を進めます。

発生土ダンプ運搬は今月も往復 100 台／日にて行う予定です。引続き交通安全に留意して運行します。

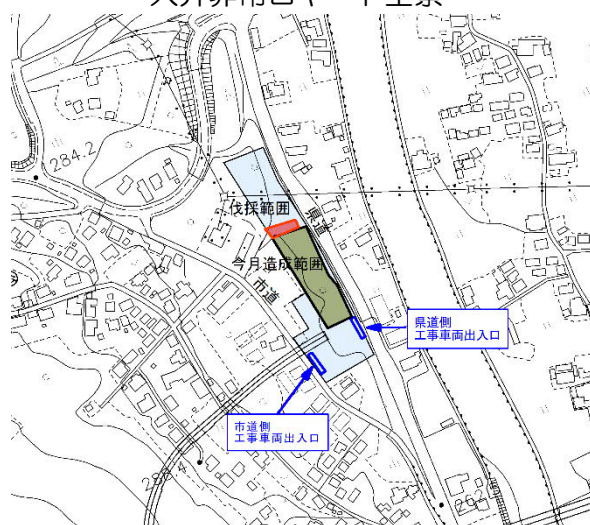

工事工程

工事内容	9月	10月	11月	備考
伐採工		■		
造成工		切土		
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1

電 話 0573-28-5026

担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023 年
11 月
vol. 12

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、往復 100 台／日にて山岡町にダンプ運搬しています。

また、ヤード北側部分において一部伐採作業を行いました。




大井非常口ヤード全景

【今月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。ブレーカーによる岩掘削を行いますので、隣接する県道への飛石等を発生させないように、防護ネットを使用しながら工事を進めます。

発生土ダンプ運搬は今月も往復 100 台／日にて行う予定です。現場からのダンプの出入りの際は、交通誘導員を配置して左右の安全をしっかりと確認して出入りするようになります。

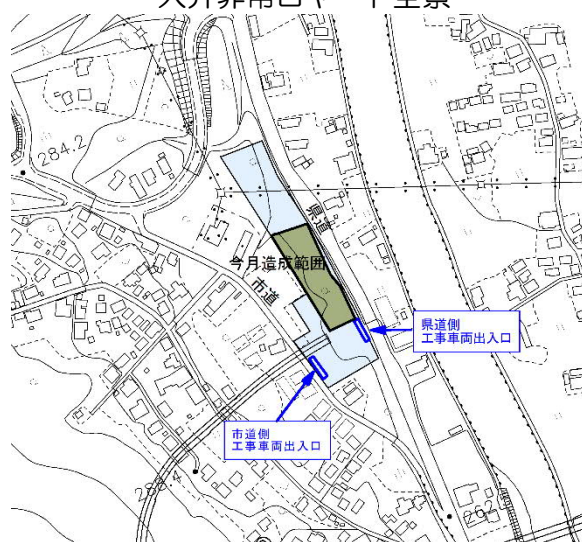

工事工程

工事内容	10月	11月	12月	備考
伐採工	■			
造成工		切土		
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）
仮囲工		■		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1
電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
12月
vol. 13

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、11月後半より往復100台／日にて山岡町にダンプ運搬しています。

また、ヤード北側部分において仮囲いの設置を行いました。




【今月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も往復100台／日にて行う予定です。朝晩が冷え込んできて、道路面の凍結が予想されるため、全車両のスタッドレスタイヤを装着させ、スリップ事故の防止に努めます。また、小中学校は冬休みに入りますので、ダンプ運行時の交通安全についても引き続き留意して作業を行います。

年末年始の休工は12/29～1/8までです。

大井非常口ヤード全景

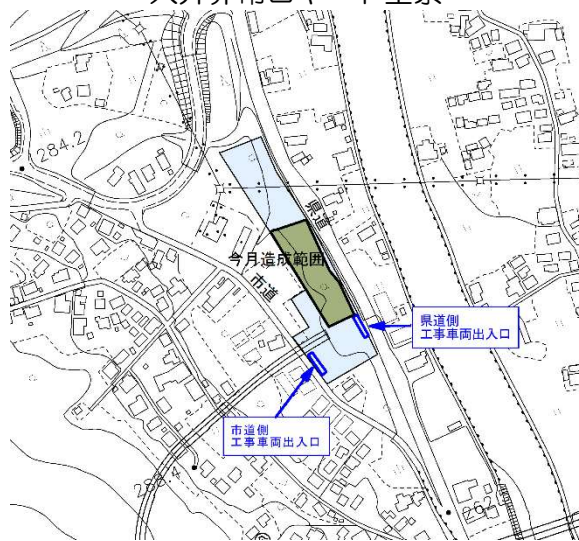

工事工程

工事内容	11月	12月	1月	備考
造成工	切土			
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住 所 恵那市武並町藤208-1
電 話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
