

# 中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年  
**7**月  
vol. 20

## 工事状況等

この度は、長島トンネル名古屋方の遮水型土砂ピット観測井における水質調査で、六価クロム基準値が超過したにもかかわらず、確認不足のため超過に気づくのが遅れ、岐阜県への報告が遅れたことにつきまして地域の皆様大変なご迷惑とご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。再発防止に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

### 【進捗状況】（6.15 時点）

造成工としてトンネル工事施工ヤード南側を横断する水路の付替え工事を行っております。

水路の付替え工事ともなって発生する土は、施工ヤード内に仮置きしたため三郷町へダンプ運搬は行っておりません。

また、三郷町の発生土置き場にて造成工で発生した岩の破碎作業を行っております。



大井非常口ヤード南側


### 【7月の予定】

引き続き施工ヤード南側の水路付替え工事を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

また、三郷町の発生土置き場にて岩の破碎作業を行う予定です。

水路付替え工事において、引き続き切土作業に伴う重機の稼働があるため、低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等を使用し、周辺環境に配慮して工事を進めてまいります。また、7月下旬から8月上旬にかけて、大型土嚢等撤去作業のため県道の片側交互規制を行う可能性がございます。規制を行う際の規制時間は9:00～17:00とし、歩行者通路は規制中も確保いたします。

梅雨に伴いまとまった降雨が予想されるため、排水システムの整備も行っております。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

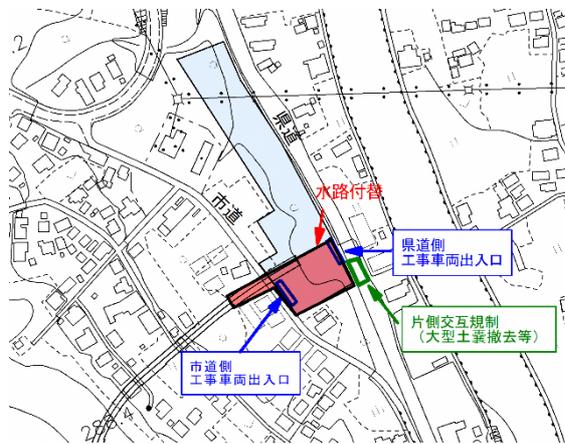

### 工事工程

工事内容	6月	7月	8月	備考
造成工	・水路付替え (ヤード南側) ・岩破碎(三郷)	・水路付替え (ヤード南側) ・岩破碎(三郷)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	運搬なし	100台(往復)	100台(往復)	
片側交互規制 (県道)		県道規制	県道沿い大型土嚢撤去等	

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1  
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
