

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2024年
5月
vol. 18

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事とヤード北側にて水路の付け替え工事を行っています。

切土工事にともなって発生する土は、最大で往復100台/日にて三郷町にダンプ運搬しています。

また、場外では3月下旬から4月上旬にかけて早層洞新田線の道路上に張り出した樹木の伐採を行いました。



大井非常口ヤード全景


【5月の予定】

引き続きヤード造成のための切土作業を行います。発生土ダンプ運搬は今月も最大で往復100台/日で行う予定です。

引き続き切土工において低騒音型機械の使用、飛石対策ネット等の使用により、周辺環境に配慮しながら作業を行ってまいります。

また、5/20より施工ヤード南側を横断している水路の付替え工事を行います。

ゴールデンウィークの現場閉所期間は4/27～5/6までを予定しております。発生土運搬における安全運転を心がけると同時に、切土作業における周辺環境への影響にも配慮して工事を進めてまいります。地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

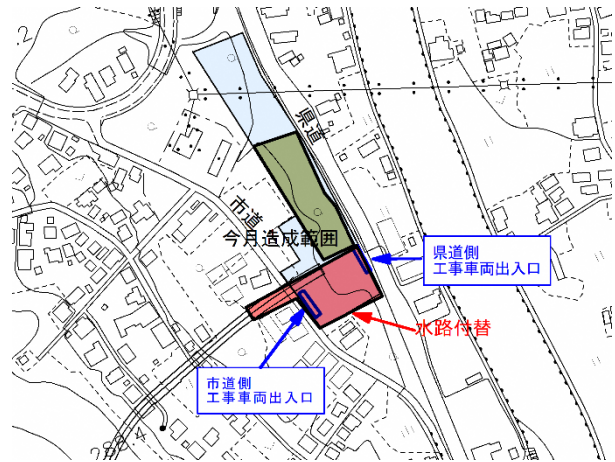

工事工程

工事内容	4月	5月	6月	備考
造成工	・切土 ・水路付替え (ヤード北側)	・切土 ・水路付替え (ヤード南側)	・水路付替え (ヤード南側)	
発生土運搬	100台(往復)	100台(往復)	100台(往復)	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1
電話 0573-28-5026 担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。
